

(仮称)市営青山三丁目アパート新2号館建設(建築主体)工事の進捗状況について

1 工事の概要

- (1) 名称 (仮称)市営青山三丁目アパート新2号館建設(建築主体)工事
- (2) 工期 平成26年6月27日から平成27年3月13日
- (3) 契約の金額 411,804,000円(税込)
- (4) 請負業者 菱和建设・吉武建設特定共同企業体

2 工事進捗状況について

本工事は平成26年6月議会の承認を得て、平成26年6月27日に工事を着手している。

当初の計画では杭工事については9月中に完了させる予定であったが、杭工事の施工中に施行箇所である旧市営青山三丁目8号館と7号館の間の土中から旧兵舎の建物と思われる基礎等が発見された。


このことから基礎等の解体及び搬出に時間を要することとなり、その後の工事に遅れが生じるものである。


現在(11/14)は、基礎のコンクリート工事を終了し躯体工事に着手する状況である。

3 今後の見込み

工事期間については、完成までに約1ヶ月程度の遅れが予測され、各工程の調整などを図りながら早期の完成を目指すものの、現状のままでは、年度を超える見込みとなっている。

4 工事工程

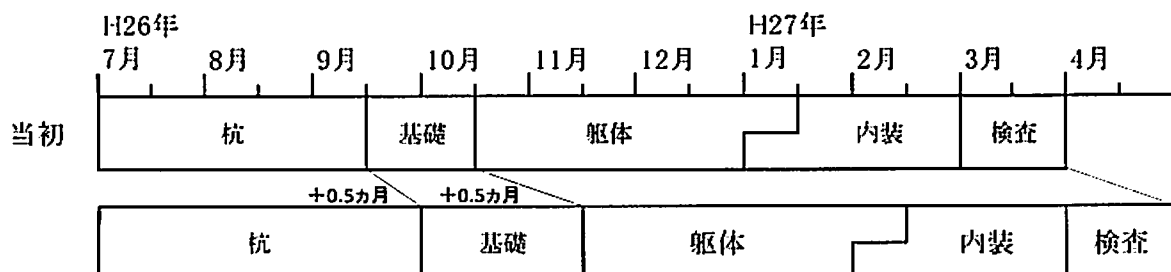

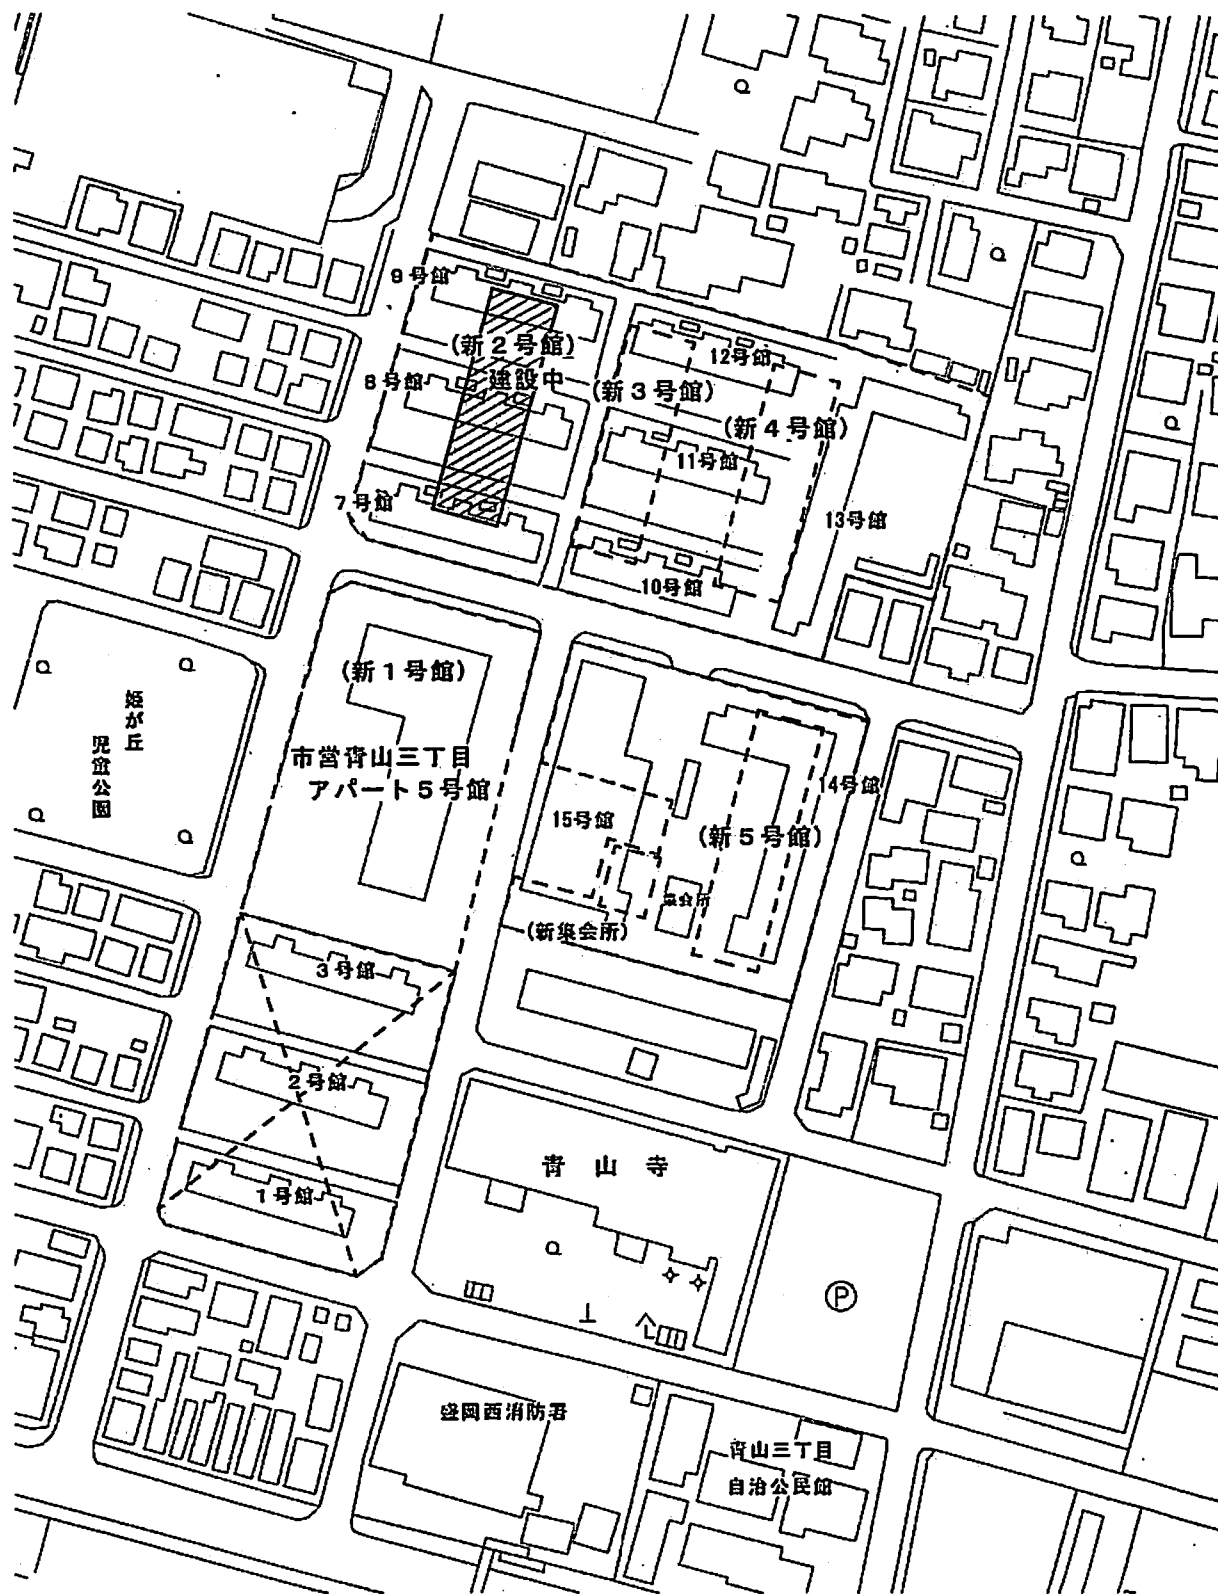

(仮称) 市営青山三丁目アパート新2号館建設工事 見取図
