

盛岡駅東口・西口交通改善工事等の進捗状況について

平成27年11月24日

建設部・都市整備部

1 趣旨

盛岡駅周辺の交通課題の改善とともに、平成28年に開催される希望郷いわて国体・希望郷いわて大会に向け、東口および西口において交通改善工事等を進めているところである。これらの進捗状況について説明するものである。

2 整備の進捗状況

(1) 東口の整備について

・丁字交差点へのエレベーター設置工事

躯体及び鉄骨組立ては完成し、現在はエレベーター本体工事を実施しており、完成は12月末、供用開始は1月上旬の予定である。

・駅前広場改良工事

工事の進捗に合わせてタクシープールを移動しながら施工を進めており、工事は12月末の完成を予定している。一方、丁字交差点における駅前広場から開運橋方面への右折運用が12月15日に予定されており、運用においてその対応を図るものである。

なお、一般駐車場の再開時期については、1月上旬を予定している。

(2) 西口の整備について

・エレベーター設置工事

10月下旬に契約し、平成28年2月下旬の完成、3月から供用開始の予定である。

・バス乗場整備工事

西口交通広場1階に隣接するバス乗場整備については11月下旬に入札予定で、平成28年3月中に歩行空間とバス乗場・待機所の舗装等が完成の予定である。

3 その他

(1) 東口について

① 交通規制の変更について

・不來方橋の盛南大橋方面への左折レーン増は8月に実施済み。

・駅前丁字交差点の駅前広場から開運橋方面への右折運用、市道開運橋

夕顔瀬橋線の開運橋側交差点等の右折禁止については、12月15日に予定されている。

- ・駅前広場から東側街区への横断歩道について、存続を求める意見が寄せられており、工事完了後の状況を見ながら警察と相談したい。

② 案内サインの変更について


今回のエレベーター増設や駅前広場の改変に伴う案内サインの変更については、冬季国体を含む年度内は仮設により試行を行うこととし、利用者の意見を考慮し、夏までには本設置したい。

(2) 東西駅前広場におけるバスの発着について

基本的には、東口を都市内路線、西口の上部は都市間路線、下部は貸切としてバス協会等と協議を継続中である。

国体に向けた整備の方針

資料 1

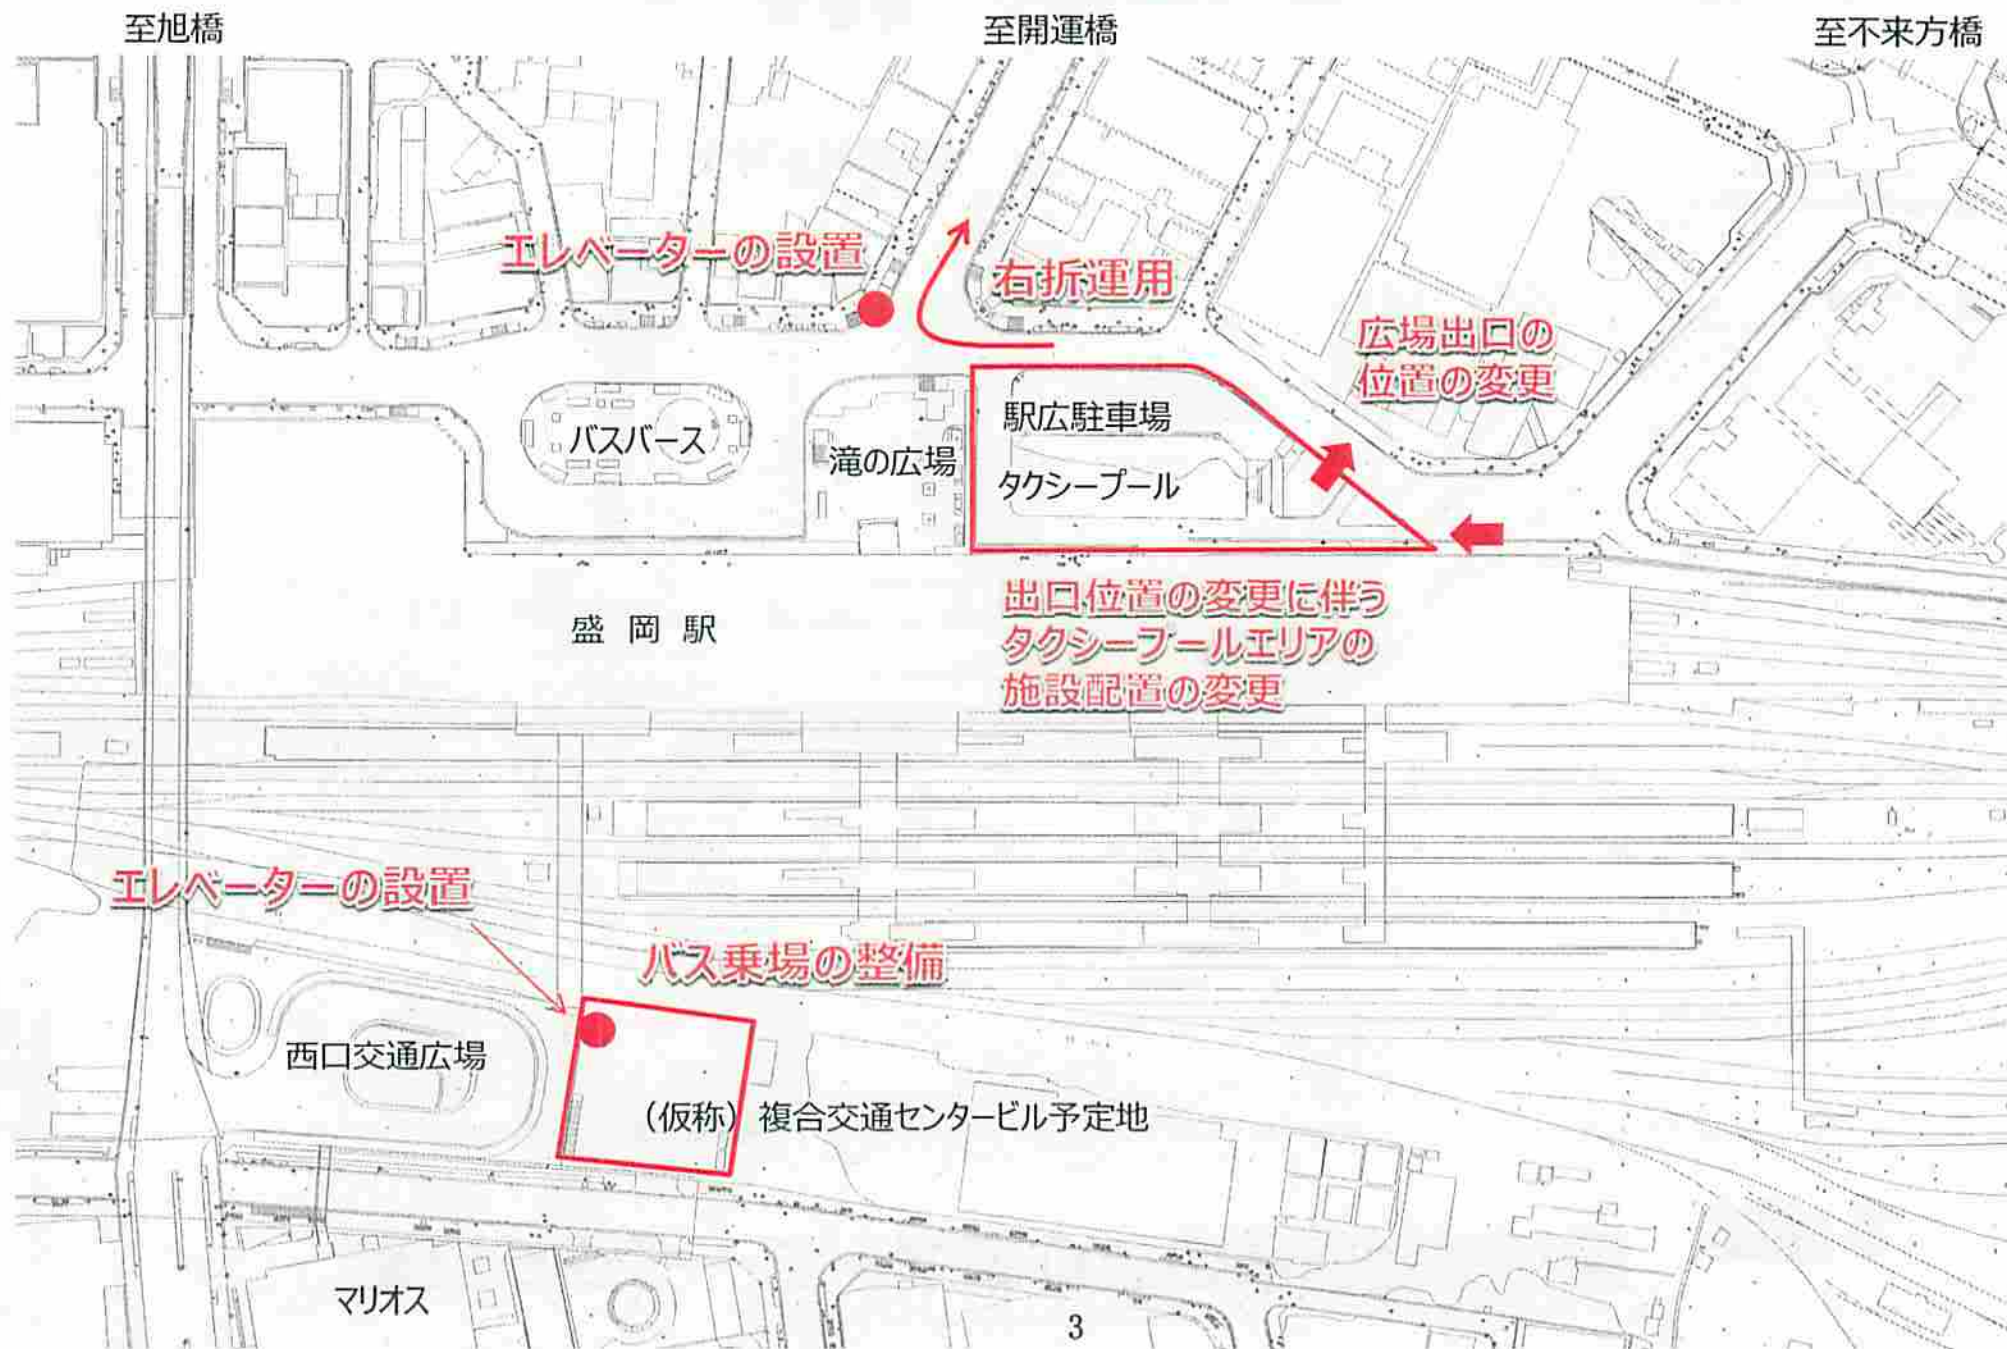

東口タクシープールエリアの施設配置計画 資料2




盛岡駅

資料3


盛岡駅西口バス乗場整備事業

平成27年11月
都市整備部 市街地整備課

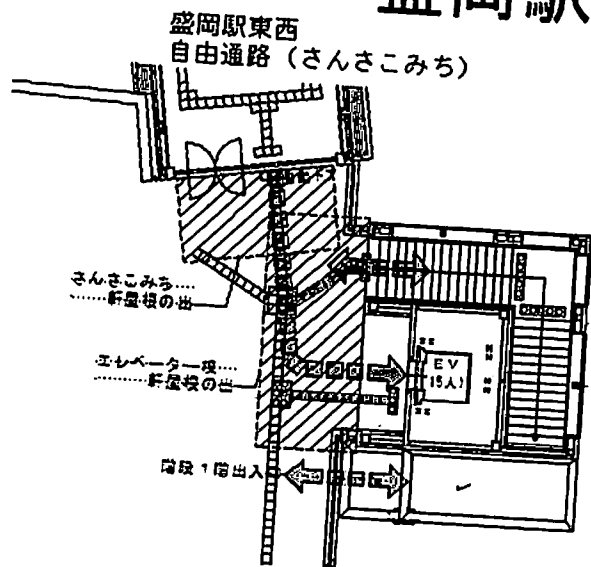

2階平面図

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| エレベータ仕様 | |
| 用途 (形式) | 乗用兼車いす用 |
| 定員 (積載量) | 15人 (1,000kg) |
| 速度 | 45m/min |
| 車いす仕様 | かご内鏡
かご内手すり
車いす用操作盤 (点字銘板付) |
| 視覚障がい者仕様 | 音声案内装置
その他点字表示 |
| 防犯仕様 | かご内防犯用CCDカメラ付
大型防犯窓 |

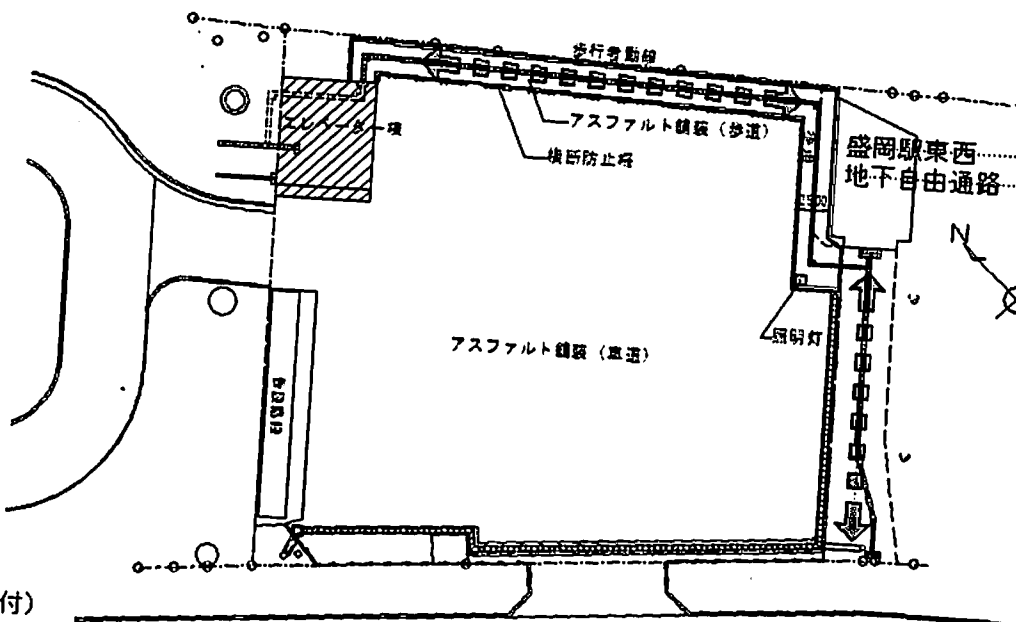

バス乗場平面図

交通規制の変更

資料4

