

新市建設計画の進捗状況と今後の見通しについて

平成26年11月25日  
市長公室

盛岡市・玉山村新市建設計画の計画期間（平成18年度～27年度）が残り1年余りとなっていることから、計画に位置付けている主要事業の進捗状況と今後の見通しについて報告するものである。

1 主要事業128事業の実績と平成26年度の進捗状況

別紙1のとおり。

2 ハード事業96事業の実績と今後の見通し（詳細は別紙2のとおり。）

(1) 事業数の進捗見通し

(単位 事業数)

	現計画期間（～H27）		
	H25年度末	H26年度末	H27年度末
計画事業数	96[60]	96[60]	96[60]
未着手事業	14[13]	13[12]	12[11]
着手中事業	40[20]	38[20]	29[18]
完了事業	42[27]	45[28]	55[31]
着手率	85.4%[78.3%]	86.5%[80.0%]	87.5%[81.7%]
完了率	43.8%[45.0%]	46.9%[46.7%]	57.3%[51.7%]

※ [ ]内は玉山区域に係る数値

- 平成27年度末時点での着手率は 87.5%、完了率は 57.3%  
(玉山区域分の着手率は 81.7%、完了率は 51.7%)
- 平成27年度末までに完了が見込めない事業は41事業（詳細は別紙3のとおり。）  
(うち玉山区域分は29事業)

(2) 事業費及び合併特例債の見通し

(単位 千円)

	計画額 (変更前)	計画額 (変更後)	現計画期間（～H27）		
			H25年度末	H26年度末	H27年度末
総事業費 (96事業)	98,606,736 [19,462,698]	82,504,421 [16,032,925]	68,773,224 [11,152,380]	74,725,537 [12,555,357]	82,200,163 [14,328,957]
合併特例債 発行見込額	17,441,800 [6,462,900]	17,430,700 [5,183,000]	10,462,200 [2,573,700]	12,704,300 [3,273,300]	15,370,500 [4,275,400]

※ [ ]内は玉山区域に係る数値

- 平成27年度末時点での合併特例債の発行見込額は 15,370,500千円  
(うち玉山区域分は 4,275,400千円)
- 本市の合併特例債発行可能額は 18,246,200千円

### 3 計画変更について

#### (1) 計画期間の延長

平成27年度末時点での完了率は57.3%となる見込みであり、東日本大震災の被害に対する地方債の特例措置により、合併特例債の発行期間を最大で10年間延長することが可能となっていることから、平成28年度以降も継続して事業の進捗を図るため、計画期間を延長する必要がある。

#### (2) 主要事業の見直し

合併から今日までの社会情勢の変化等により、実施が見込めない事業や代替事業の検討が必要な事業が見受けられるため、事業の廃止など、主要事業を見直す必要がある。

#### (3) 合併特例債の有効活用

計画の変更にあたっては、平成28年度以降の活用対象事業や活用予定額を見直し、有効に活用する必要がある。

## 主要事業128事業の実績と平成26年度の進捗状況

## ■ 総括表① (事業数)

事業区分	区域	計画数 【変更前】	計画数 【変更後】	H25までに着手した事業		未着手 事業	完了 事業	着手率	完了率	H26に 新規着手	内訳
				(うちH24ま でに完了)	(うちH25 に完了)						
ハード	盛岡	28	29	28	(13)		1	13	96.6%	44.8%	
	玉山	59	60	47	(25)	(2)	13	27	78.3%	45.0%	1 No.115 その他市道 渋民東線
	盛岡玉山	7	7	7	(2)			2	100.0%	28.6%	
	計	94	96	(82)	(40)	(2)	14	42	85.4%	43.8%	1
ソフト		32	32	32	(5)			5	100.0%		
合計		126	128	114	(45)	(2)	14	47	88.1%		

(備考) 着手率、完了率は計画数【変更後】に対する率

## ■ 総括表② (事業費)

(単位 千円)

事業区分	区域	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	実績			H26 予算
				H18~25実績	H18~24実績	H25決算 (繰越額含む)	
ハード	盛岡	76,463,777	64,595,336	55,830,787 (73.0%)	51,687,793 (67.6%)	4,142,994	4,532,883
	玉山	19,462,698	16,032,925	11,152,380 (57.3%)	10,658,965 (54.8%)	493,415	1,402,977
	盛岡玉山	2,680,261	1,876,160	1,780,057 (66.8%)	1,663,944 (62.1%)	126,113	16,453
	計	98,606,736	82,504,421	68,773,224 (69.7%)	64,010,702 (64.9%)	4,762,522	5,952,313
ソフト		—	—	12,836,419	11,297,956	1,538,463	1,538,398
合計				81,609,643	75,308,658	6,300,985	7,490,711

(備考) (%) は計画額【変更前】に対する執行率

主要 施策	個別施策	No.	事業名	区分	担当課等	区域	事業実施時期			事業費				事業の概要等		
							計画	実績 (見込)	H25末 の状況	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	H25まで の実績	H24まで の実績		H25決算 繰越額含む	H26 予算
I 一人ひとりの心がか よう快適な 地域社会 の形成	情報通信 機能の整 備	1	証明書自動交付機設置事業	ハード	市民登録課	玉山	18~22	18~19	完了	31,381	10,983	10,983	10,983	0	0	住民票等の自動交付機1台の設置 (玉山総合事務所1階)
		2	高度情報化推進事業	ソフト	情報企画室	盛岡 玉山	18~23	18~27	着手中	—	—	183,185	161,962	21,223	22,302	電子市役所の構築 (電子申請, 電子入札システム等)
		3	移動通信用鉄塔整備事業	ハード	総務課(玉山)	玉山	18~22	18~21	完了	368,000	136,296	136,296	136,296	0	0	携帯電話用鉄塔の整備(H18 岩洞湖地区, H19 外山地区, H20 姫神地区, H21 町村地区※)※民 間事業者の経営判断による整備が行われた。
	消防・防災 体制の強 化	4	コミュニティ消防センター整備事業(町の平地区)	ハード	消防防災課	玉山	18~20	18~19	完了	55,000	62,574	62,574	62,574	0	0	コミュニティ消防センターの整備 玉山区川又字道地58-3 鉄骨造平屋建 延床面積 258.36㎡
		5	コミュニティ消防センター整備事業(小貝沢地区)	ハード	消防防災課	盛岡	18	18	完了	20,000	20,874	20,874	20,874	0	0	コミュニティ消防センターの整備 新庄字小貝沢72-5 木造平屋建 延床面積 73.29㎡
		6	消防署玉山分署建設事業	ハード	消防防災課	玉山	18~20	18~20	完了	364,000	334,935	334,935	334,935	0	0	盛岡中央消防署玉山出張所の移転新築 (玉山総合事務所隣の) 鉄骨造2階建 延床面積 924.70㎡
		7	消防施設整備事業	ハード	消防対策室	玉山	18~27	18~27	着手中	271,700	230,635	189,368	187,483	1,885	27,602	消防自動車, 消防屯所の更新
		8	都市基盤河川改修事業	ハード	河川課	盛岡	18~27	18~27	着手中	3,000,000	2,931,564	2,342,763	2,048,364	294,399	294,400	一般河川南川の改修工事 函館設置工 545.26m, 築堤・護岸工 2,200m, 上層 覆土工 1,050m
		9	準用河川 大橋川改修事業	ハード	玉山事務所 (上下水)	玉山	18~21	18~21	完了	300,000	358,959	358,959	358,959	0	0	洪氾地区土地区画整理地内を流れる「大橋川」の 改修
		10	交通安全・ 防犯対策 の推進	ハード	道路管理課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	110,000	394,906	343,536	319,387	24,149	2,800	町内会への貸出用小型除雪機の整備及び大型除 雪機械の更新
II 健やかで 心と心が 触れ合う 保健医療・ 福祉の充 実	保健医療 の充実	11	保健所設置事業	ハード	中核市推進事 務局	盛岡 玉山	19~20	18~19	完了	1,500,000	1,034,841	1,034,841	1,034,841	0	0	保健所の整備(平成20年4月1日の中核市移行に より保健衛生に係る業務を行うため, 旧競馬会館 (神明町3-28)を取得し, 改修したもの。)
		12	健康教育事業	ソフト	健康推進課・ 健康福祉課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	23,045	20,568	2,477	2,526	保健所フェスタ健康講座, 地区健康教室, 健康アッ プ教室等の開催
		13	健康診査事業	ソフト	健康推進課・ 健康福祉課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	4,653,462	4,127,342	526,120	489,257	各種がん検診, 肝炎ウイルス検診
		14	乳幼児健康診査事業	ソフト	健康推進課・ 健康福祉課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	877,128	784,103	113,023	114,159	3歳児までの各健康診査など
		15	救急医療対策事業	ソフト	企画総務課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	334,463	304,798	29,665	52,662	休日, 夜間等に入院治療を必要とする救急患者を 輪番制で診療する病院への運営費補助
	福祉の充 実	16	地域福祉推進事業	ソフト	地域福祉課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	48,816	44,142	4,674	4,841	(社福)盛岡市社会福祉協議会の運営費補助

主要 施策	個別施策	No.	事業名	区分	担当課等	区域	事業実施時期			事業費					事業の概要等		
							計画	実績 (見込)	H25末 の状況	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	H25まで の実績	H25決算 繰越額含む			H26 予算	
													H24まで の実績	H25決算 繰越額			
Ⅱ 健やかで 心と心が 触れ合う 保健医療・ 福祉の充 実	福祉の充 実	17	母子通園事業	ソフト	障がい福祉課	盛岡 五山	18~27	18~27	着手中	—	—	726,560	646,902	79,658	78,201	幼児の発達支援を行う市立ひまわり学園への運営費補助	
		18	在宅介護支援センター運営事業	ソフト	介護高齢福祉課	盛岡 五山	18~27	18~19	完了	—	—	39,329	39,329	0	0	介護保険利用者の地域での生活を支援する団体への運営費補助。 ※現在は「地域包括支援センター」が実施。	
		19	老人クラブ活動促進事業	ソフト	高齢者支援室	盛岡 五山	18~27	18~27	着手中	—	—	201,788	176,673	25,113	25,702	老人クラブ連合会及び各地域の老人クラブの活動支援(運営費補助)	
		20	地域子育て支援センター事業	ソフト	子ども未来課	盛岡 五山	18~27	18~27	着手中	—	—	363,842	310,765	53,077	60,932	市内の保育所7園での保育所開放、子育て講座、子育てサークルの情報提供・支援など	
		21	特別保育事業	ソフト	子ども未来課	盛岡 五山	18~27	18~27	着手中	—	—	2,615,930	2,222,509	393,421	403,490	保育所での延長保育、一時預かり、休日保育等の実施	
		22	盛岡駅周辺地区バリアフリー整備事業	ハード	道路建設課	盛岡	18~20	18~21	完了	50,000	33,692	33,692	33,692	0	0	盛岡駅周辺における歩行者誘導ブロック、案内サイン等の整備	
環境衛生 の充実		23	火葬場整備事業	ハード	市民登録課	盛岡	18~22	18~24	完了	2,595,570	2,970,943	2,968,943	2,968,943	0	0	老朽化した市営火葬場の建替え	
		24	岩手・五山斎場整備事業	ハード	税務住民課	五山	20		未着手	65,400	65,400	0	0	0	0	岩手町との一部事務組合が運営する火葬場(浄霊苑)の改修	
Ⅲ 未来を築く 心豊かな 人材の育 成	学校教育 の充実	25	小学校整備事業	ハード	総務課(教育)	盛岡	18~27	18~27	着手中	4,287,731	2,272,360	1,560,018	1,468,744	111,274	234,774	盛岡地域における小学校の校舎等の改築等	
		26	洪民小学校施設整備事業	ハード	総務課(教育)	五山	18~21	18~24	完了	1,373,581	1,428,895	1,427,536	1,427,536	0	0	0	洪民小学校の移転新築
		27	玉山小学校施設整備事業	ハード	総務課(教育)	五山	25~27		未着手	436,200	52,755	0	0	0	0	0	玉山小学校の校舎及び屋内運動場の改築
		28	巻堀小学校体育施設整備事業	ハード	総務課(教育)	五山	18~19	18~19	完了	67,550	62,413	62,413	62,413	0	0	0	巻堀小学校のプール整備(25m×12m)
		29	中学校整備事業	ハード	総務課(教育)	盛岡	18~27	18~29	着手中	5,144,901	3,742,941	3,354,704	2,991,557	363,147	132,775	盛岡地域における中学校の校舎等の改築等	
		30	巻堀中学校施設整備事業	ハード	総務課(教育)	五山	21~25	25~28	着手中	1,113,596	605,699	38,255	0	38,255	556,084	巻堀中学校の校舎増築、既存校舎大規模改造、屋内運動場建築等	
		31	学校給食調理場設備改善事業	ハード	学務教職員課	盛岡	18~20	18~20	完了	42,786	33,396	33,396	33,396	0	0	0	老朽化している調理用機器等の更新
		32	学校給食センター施設更新事業	ハード	学務教職員課	五山	18	18~21	完了	100,000	33,637	33,637	33,637	0	0	0	玉山学校給食センターにおける調理用機器等の更新

主要 施策	個別施策	№	事業名	区分	担当課等	区域	事業実施時期			事業費					事業の概要等	
							計画	実績 (見込)	H25末 の状況	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	H25まで の実績	H24まで の実績	H25決算 繰越額含む		H26 予算
Ⅲ 未来を築く 心豊かな 人材の育成	学校教育 の充実	33	学校プール整備事業	ハード	総務課(教育)	盛岡	18~27	18~31	着手中	770,000	243,291	205,433	205,433	0	4,237	耐用年数を超えたプールの更新(コンクリート槽からステンレス槽へ改修)
		34	生涯学習推進事業	ソフト	生涯学習課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	11,579	7,860	3,719	6,120	人材サポートシステム事業、もりおかまちづくり出前講座、学習情報提供
		35	学習機会の提供事業	ソフト	生涯学習課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	468,464	457,963	10,501	12,378	公民館等における学習機会の提供
	社会教育 の充実	36	公民館建設事業(松園)	ハード	生涯学習課	盛岡	18~19	18~24	完了	500,000	569,212	573,231	573,231	0	0	東松園小学校内での地区公民館整備 A棟:小学校の余裕教室を活用した施設の整備 B棟:ホール等の整備(新築、松園連絡所併設)
		37	玉山地区公民館整備事業	ハード	生涯学習課	玉山	19	19~21	完了	240,000	177,852	177,852	177,852	0	0	地区公民館の移転新築(玉山出張所併設) 玉山区日戸字鷹高50-16 木造平屋建て 延床面積 441.85㎡
		38	自治公民館助成事業	ソフト	市民協働推進課	盛岡	18~27	18~27	着手中	—	—	202,774	181,624	21,150	21,261	市内に184館ある自治公民館の活動や施設改修への補助
		39	地区集会所施設整備事業	ハード	総務課(玉山)	玉山	18~24	18~25	完了	218,000	326,798	324,929	281,464	43,465	0	玉山区における地区コミュニティセンターの整備(7地区)
	生涯ス ポーツの 振興	40	生涯スポーツ推進事業	ソフト	スポーツ推進課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	364,741	296,817	67,924	55,784	指導者養成、スポーツ教室開催、体育団体育成、市民体力づくり、体育の日記念行事、学校体育施設開放事業など
		41	生涯スポーツ施設整備事業	ハード	スポーツ推進課	盛岡	25~27	25~28	着手中	—	2,118,151	420,155	0	420,155	1,316,721	つなぎ多目的運動場整備、通年型スケートリンク整備、太田テニスコート上屋整備、アイスアリーナ改修
		42	社会教育施設整備事業	ハード	スポーツ推進課	玉山	18~21	22~25	完了	417,600	413,220	421,927	411,082	10,845	0	好摩地区体育館の整備
		43	運動公園整備事業	ハード	スポーツ推進課	玉山	20~23	27~28	未着手	400,000	400,000	0	0	0	0	洗民運動公園内の競技施設の改修
	文化の振 興	44	芸術文化活動振興事業	ソフト	文化国際室	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	299,625	268,923	30,702	29,707	芸術団体等が行う芸術文化活動の振興
		45	文化財保護事業	ソフト	歴史文化課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	5,543	5,228	315	315	市内の文化財に関する調査活用等
		46	遺跡の広場ネットワーク整備事業	ハード	歴史文化課	盛岡 玉山	18~27	18~*	着手中	345,661	116,853	116,301	115,565	736	429	安倍館遺跡等の史跡環境整備
		47	歴史民俗資料館建設事業	ハード	歴史文化課	玉山	21~22		未着手	400,000	400,000	0	0	0	0	玉山区にある歴史民族資料館の移転整備
	国際交流 の推進	48	姉妹都市等国際交流事業	ソフト	文化国際室	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	77,507	65,085	12,442	8,585	姉妹都市カナダ・ビクトリア市との交流や諸外国との各種交流事業

主要 施策	個別施策	No.	事業名	区分	担当課等	区域	事業実施時期			事業費					事業の概要等		
							計画	実績 (見込)	H25末 の状況	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	H25まで の実績	H24まで の実績	H25決算 繰越額含む		H26 予算	
IV 環境と調 和し暮らし を支える 生活環境 の整備	住宅・宅地 の供給	49	洗民団地建替事業	ハード	建築住宅課	玉山	18~21	18~20	完了	160,000	98,593	98,593	98,593	0	0	市営住宅の改築 木造平屋2戸長屋建て(5棟8戸) 専有面積 54.9㎡(2DK)	
		50	夏間木第1団地建替事業	ハード	建築住宅課	玉山	23~26	21~23	完了	400,000	384,535	384,535	384,535	0	0	市営住宅の改築(市営芋田向住宅と統合整備)	
	公園・緑地 等の整備	51	花と緑のガーデン都市づくり事業	ハード	公園みどり課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	119,800	150,379	120,422	107,972	12,450	13,224	ハンギングバスケット等によるガーデン都市づくり 等	
		52	洗民地区公園整備事業	ハード	公園みどり課	玉山	18.21	18.21	完了	40,000	39,642	39,642	39,642	0	0	市民協働による洗民地区の公園整備(2か所)	
	環境との 共生	廃棄物の 抑制と適 正処理	53	廃棄物処分場整備事業	ハード	廃棄物対策課	玉山	18~19	18~20	完了	1,683,380	1,669,450	1,669,450	1,669,450	0	0	玉山区釘の平地区にある一般廃棄物処分場(埋立 処分場)の再整備
			54	自然環境調査事業	ソフト	環境企画課	盛岡 玉山	18~21	18~23	完了	—	—	12,472	12,472	0	0	玉山区内の自然環境等の調査
		55	生出地域エコタウン事業	ハード	環境企画課・ 産業振興課	玉山	25~27	25~*	着手中	—	593,554	51,300	0	51,300	48,570	玉山区生出地区を中心に、再生可能エネルギーを 活用した環境関連施設の整備や環境啓発事業の 展開	
	56	都市景観形成建築指導事業	ソフト	景観政策課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	45,621	44,382	1,239	1,494	景観指導、都市景観シンポジウムの実施、都市景 観賞の決定・表彰		
V 段から活 力あるまち をつくる産 業の振興	商業・サー ビス業の 振興	57	商店街リフレッシュ事業	ソフト	商工課	盛岡 玉山	18~27	18~20	完了	—	—	5,967	5,967	0	0	休憩用ベンチ(可動式)、トイレ案内ステッカー等の 作成、チャレンジショップ支援等	
		58	個店魅力アップ・空き店舗活用支援事 業	ソフト	商工課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	31,398	31,398	0	0	商店街の各店舗への経営アドバイス、空き店舗対 策等の実施	
	観光の振 興	59	啄木の郷観光ルート整備事業	ハード	観光課	盛岡 玉山	18~22	18~22	完了	197,400	25,079	25,079	25,079	0	0	盛岡地域と玉山区をつなぐ観光ルートの整備	
		60	岩洞湖家族旅行村木歩道整備事業	ハード	林政課	玉山	19~20	19	完了	30,000	0	0	0	0	施設内の木歩道の改修 延長 300m(岩手県による整備)		
		61	盛岡ブランド普及促進事業	ソフト	広報ブランド 戦略室・観光 課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	308,044	298,658	9,386	9,403	盛岡ブランド推進計画に基づく特産品開発、歴史 的街並みの保存活用等の実施	
		62	桜の里整備事業	ハード	産業振興課	玉山	22~23	24~28	着手中	150,000	152,070	3,344	1,769	1,575	8,186	「サクラパーク日戸」における散策路等の整備(1万 本のオオヤマザクラが植樹されている。)	
	63	道の駅設置事業	ハード	総務課(玉山)	玉山	19		未着手	300,000	300,000	0	0	0	0	国道4号洗民バイパスに道の駅を整備		
工業の振 興	64	産業クラスター推進事業 (産学官連携新産業創出事業)	ハード	企業立地推進 室	盛岡	18~19	18~19	完了	988,000	774,661	774,661	774,661	0	0	産学官連携研究センター(コラボMIU)の整備 岩手大学構内 鉄筋コンクリート3階建て 延床面積2,000㎡ 貸出ブース数34		

主要 施策	個別施策	№	事業名	区分	担当課等	区域	事業実施時期			事業費					事業の概要等				
							計画	実績 (見込)	H25末 の状況	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	H25まで の実績	H25決算 繰越額含む			H26 予算			
													H24まで の実績	H25決算 繰越額含む					
V 圏かで活 力あるまち をつくる産 業の振興	工業の振興	65	ものづくり産業推進事業	ハード	企業立地雇用課	玉山	22~25	18~*	着手中	413,090	52,438	2,438	2,438	0	0	盛岡工業団地(玉山区)の拡張による新たな工業団地の整備			
	農林業の 振興	66	農村交流センター整備事業	ハード	農政課	盛岡 玉山	18~20	23~*	着手中	241,000	90,223	92,001	6,222	85,779	0	0	農業生産者と消費者の交流拠点の整備(3か所) 釜川地区、羽場地区、東部地区の3か所を計画。		
		67	市産材利用拡大推進事業	ソフト	林政課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	17,255	6,670	10,585	10,692	0	市産材の利用拡大に向けた取組として実施する町内会等が行う公共的な施設整備への市産材の支給。		
		68	森林適正管理推進事業	ソフト	林政課・ 産業振興課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	198,789	173,643	25,126	25,130	0	0	森林の造林や除間伐、林内作業道の開設などに対する助成等	
		69	市有林造成事業	ソフト	林政課・ 産業振興課	盛岡 玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	600,418	513,411	87,007	92,881	0	0	市有林の造成と公益的機能の充実のために行う森林の保育、間伐等	
		70	団体営基盤整備促進事業(好摩地区)	ハード	農政課	玉山	21~25	25~28	着手中	25,200	9,900	3,197	0	3,197	3,300	0	0	用排水路の整備(計画延長 1,229m)	
		71	団体営基盤整備促進事業(尻志田地区)	ハード	農政課	玉山	21~24	25~29	着手中	152,000	66,000	5,999	0	5,999	10,000	0	0	農道の整備(計画延長 1,700m)	
		72	団体営基盤整備促進事業(寺林地区)	ハード	農政課	玉山	20~24		未着手	34,500	1,700	0	0	0	0	0	0	ほ場等の整備(計画面積10ヘクタール外)	
		73	団体営基盤整備促進事業(武道地区)	ハード	農政課	玉山	23~27	24~32	着手中	51,750	7,880	3,317	2,730	587	2,110	0	0	ほ場等の整備(計画面積36ヘクタール外)	
		74	有機物資源活用センター整備事業	ハード	農政課	玉山	19~20	20~24	完了	980,000	496,449	495,939	495,939	0	0	0	0	0	家畜の排せつ物を受け入れ、たい肥を生産する施設の整備
		75	有機物資源活用促進事業	ハード	産業振興課	玉山	18~20	18~21	完了	19,040	1,179	1,179	1,179	0	0	0	0	0	たい肥舎を整備する農業者への補助
		76	排水対策特別事業船田堰地区	ハード	農政課	玉山	21~25		未着手	32,800	2,500	0	0	0	0	0	0	0	用排水路の整備(計画延長 4,800m)
		77	県営ため池等整備事業(一般)洗民地区	ハード	農政課	玉山	18~21	18~24	完了	31,130	29,772	29,772	29,772	0	0	0	0	0	用排水路の整備(延長 2,236m)
		78	県営かんがい排水事業(一般)松川大堰地区	ハード	農政課	玉山	19~23		未着手	20,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	用水路の整備(計画延長 2,000m、上流で八幡平市の施設に接続。)
		79	農免農道整備事業 巻堀2期地区	ハード	農政課	玉山	24~27	24~30	着手中	20,000	33,564	4,333	3,766	567	4,012	0	0	農道の整備(計画延長 農道 400m、橋りょう 48m)	
新規創業 の支援	80	産業クラスター推進事業 (「サイエンスゆいとびあ」企業立地促進事業)	ソフト	企業立地雇用課	盛岡	20~27	20~27	着手中	—	—	0	0	0	0	0	0	盛岡南地区産業等用地(4.5ヘクタール)に立地した企業への各種補助		



主要 施策	個別施策	No.	事業名	区分	担当課等	区域	事業実施時期			事業費					事業の概要等		
							計画	実績 (見込)	H25末 の状況	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	H25まで の実績	H24まで の実績	H25決算 繰越額含む		H26 予算	
V 豊かで活 力あるまち をつくる産 業の振興	新規創業 の支援	81	産業クラスター推進事業(No.64再掲) (産学官連携新産業創出事業)	ソフト	企業立地推進 室	盛岡	18~19	18~19	完了	—	—	0	0	0	0	産学官連携研究センター(コラボMIU)の整備 岩手大学構内 鉄筋コンクリート3階建て 延床面積 2,000㎡ 貸出ブース数 34	
	雇用の創 出	82	産業クラスター推進事業(No.80再掲) (「サイエンスゆいとびあ」企業立地促 進事業)	ソフト	企業立地雇用 課	盛岡	20~27	20~27	着手中	—	—	0	0	0	0	盛岡南地区産業等用地(4.5ヘクタール)に立地し た企業への各種補助	
VI 多様な交 流を支える都市基 盤の整備	市街地の 整備	83	盛岡南地区都市開発整備事業	ハード	盛岡南整備課	盛岡	18~27	18~27	着手中	10,062,073	6,833,605	6,391,082	6,062,420	328,662	303,809	盛岡南地区313.5ヘクタールの街区整備、道路整 備等	
		84	盛岡駅西口地区土地区画整理事業	ハード	市街地整備課	盛岡	18~25	18~21	完了	5,075,741	5,854,018	5,854,018	5,854,018	0	0	盛岡駅西口35.2ヘクタールの街区整備、電線類地 中化工事等	
		85	まちづくり交付金事業(盛岡駅西口地 区)	ハード	市街地整備課	盛岡	19~27	19~23	完了	1,328,000	877,940	877,940	877,940	0	0	盛岡駅東西自由通路の整備や多目的広場、大型 情報案内板などの整備	
		86	盛岡駅西口地区駐車場整備事業	ハード	市街地整備課	盛岡	19~27		未着手	74,000	10,000	0	0	0	0	市営駐車場の整備	
		87	都市計画マスタープラン策定事業	ソフト	都市計画課	盛岡 玉山	18~22	18	完了	—	—	649	649	0	0	0	都市計画マスタープラン地域別構想の策定(洗民 地区及び好摩地区)
		88	洗民駅北地区土地区画整理事業	ハード	市街地整備課	玉山	25~27		未着手	72,000	10,000	0	0	0	0	0	洗民駅北地区10.4ヘクタールの土地区画整理事業 (組合施行)への補助
		89	野中土地区画整理事業補助金	ハード	市街地整備課	玉山	27		未着手	29,000	10,000	0	0	0	0	0	五山区野中地区12.6ヘクタールの土地区画整理事業 (組合施行)への補助
	交通基盤 の整備	90	バス利用促進対策事業	ハード	交通政策課	盛岡 玉山	18~20,22	18~27	着手中	166,400	63,879	57,877	54,878	2,999	0	0	バスロケーションシステムやハイグレードバス停の 整備
		91	広域圏道路整備事業「北松園四丁目 小島沢線」	ハード	道路建設課	盛岡	18~21	18~22	完了	614,275	897,326	897,326	897,326	0	0	0	北松園四丁目〜クリーンセンター〜上田字小島沢 の道路築造 延長 1,255m 幅員 11.5m
		92	広域圏道路整備事業「市道谷地頭線」	ハード	道路建設課	盛岡	18~26	19~26	着手中	1,250,000	1,027,244	884,524	816,383	68,181	120,500	0	IGR厨川駅北側の「元滝沢踏切」を中心とする路線 の整備 延長 465m 幅員 18.0m
93		都市計画道路 中ノ橋山岸線Ⅲ工区	ハード	道路建設課	盛岡	18~21	18~24	完了	1,197,800	1,630,477	1,630,409	1,630,409	0	0	0	加賀野四丁目〜山賀橋〜山岸一丁目の道路整備 延長 270m(うち橋りょう部78m) 幅員 17.0m	
94		都市計画道路 梨木町上米内線Ⅱ工 区	ハード	道路建設課	盛岡	18~26	18~30	着手中	5,038,800	5,471,911	4,331,752	4,020,629	311,123	393,230	0	県道盛岡横手線交差点(河北小学校付近)〜上田 郵便局交差点の道路改良, JR山田線踏切拡幅等 延長 683m 幅員 25.0m(4車線)	
95		都市計画道路 盛岡駅南大通線(不來方橋)	ハード	道路建設課	盛岡	18	18	完了	148,600	225,384	225,384	225,384	0	0	0	盛岡駅前通〜不來方橋〜開運橋通の道路築造 延長 312m(うち橋りょう部 75.3m) 幅員 28.0m(4車線)	
96	都市計画道路 盛岡駅南大通線(神子田Ⅰ)	ハード	道路建設課	盛岡	18~27	18~24	完了	1,243,200	863,201	863,046	863,046	0	0	0	国道4号と国道396号との交差点〜神子田町の道 路改良 延長 297m 幅員 28.0m(4車線)		

主要 施策	個別施策	№	事業名	区分	担当課等	区域	事業実施時期			事業費					事業の概要等	
							計画	実績 (見込)	H25末 の状況	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	H25まで の実績	H24まで の実績	H25決算 繰越額含む		H26 予算
VI 多様な交 流を支え る都市基 盤の整備	交通基盤 の整備	97	都市計画道路 盛岡駅南大通線(大沢川原)	ハード	道路建設課	盛岡	18~27	18~29	着手中	1,930,000	1,908,310	1,797,046	1,642,538	154,508	88,000	大正館(旅館)~岩手女子高等学校付近の道路改良 延長 220m 幅員 28.0m(4車線) ※当道は、暫定2車線で供用する。(H23~)
		98	都市計画道路 明治橋大沢川原線(大通)	ハード	道路建設課	盛岡	20~27	19~29	着手中	960,000	2,160,911	1,605,697	1,114,301	491,396	302,957	クロステラス~菜園通の道路改良 延長 161m 幅員 25.0m(4車線)
		99	都市計画道路 盛岡駅青山線(R46交差部)	ハード	道路建設課	盛岡	18~19	18~19	完了	687,300	689,865	689,865	689,865	0	0	前九年一丁目~国道46号(アンダーパス)~前九 年二丁目の道路改良 延長 418m 幅員 12.0m~14.0m
		100	都市計画道路 盛岡駅青山線(前九年Ⅱ)	ハード	道路建設課	盛岡	19~27	20~28	着手中	805,000	391,084	248,347	176,241	72,108	95,000	№99に続き、前九年二丁目~ふれあい橋(IGRの 跨線橋)の道路改良 延長 434m 幅員 12.0m
		101	都市計画道路 上厨川厨川五丁目線(赤坂Ⅱ)	ハード	道路建設課	盛岡	18~23	19~29	着手中	525,000	337,707	296,453	227,708	68,747	41,000	県営青山アパート付近の道路改良 延長 209m 幅員 16.0m
		102	都市計画道路 岩手飯岡駅南公園線外1路線	ハード	道路建設課	盛岡	22~27	21~32	着手中	760,000	870,458	687,204	469,482	217,722	223,200	JR岩手飯岡駅~盛岡南公園の道路築造 延長 730m 幅員 19.0m 交通広場 3,850㎡ 岩手飯岡駅東西線自由通路 延長 110m 幅員 4.0m エレベーター2基
		103	都市計画道路 洗民鶴飼線	ハード	道路建設課	玉山	18	18	完了	300,000	64,000	64,000	64,000	0	0	玉山区洗民の「コメリ」付近~国道4号洗民バイバ ス交差点の道路改良 延長 467m 幅員 16.0m
		104	厨川駅地下自由通路及び西口整備事 業	ハード	道路建設課	盛岡	18~22	18~26	着手中	1,000,000	1,839,699	1,805,245	1,756,625	48,620	10,000	IGR厨川駅における地下自由通路、西口広場等の 整備 延長 130m 幅員 4.0m(歩行者・自転車用)
		105	IGR下田駅設置事業	ハード	道路建設課	玉山	27		未着手	110,000	110,000	0	0	0	0	IGR洗民駅と好摩駅の間での新駅整備
		106	一級市道 沢目線	ハード	道路建設課	玉山	18	18	完了	47,000	12,500	12,500	12,500	0	0	№103に続く国道4号洗民バイパス東側の道路改 良 延長 144m 幅員 10.0m
		107	一級市道 好摩永井線	ハード	道路建設課	玉山	18~22	18~30	着手中	400,000	300,897	279,454	278,794	680	12,500	IGR好摩駅西口~樹沢橋~永井橋の道路改良(歩 道整備) 延長 3,834m 歩道幅員 2.5m(片側設置)
		108	一級市道 洗民好摩線	ハード	道路建設課・ 建設課(玉山)	玉山	19~23	20~30	着手中	800,000	270,583	147,009	146,530	479	39,000	鶴飼橋(洗民総合運動公園付近)~IGR好摩駅東 口の道路改良(歩道設置、横りょう補修等) 延長 2,562m 歩道幅員 2.5m(片側設置)
		109	一級市道 下田生出線	ハード	道路建設課	玉山	20~24	22~32	着手中	520,000	169,348	117,921	117,921	0	40,500	玉山区下田(下田踏切付近)~同学生出の道路改 良 延長 2,840m 幅員12.0m
110	一級市道 柴沢下田線	ハード	道路建設課	玉山	21~24	24~30	着手中	307,000	206,949	38,425	9,526	28,899	40,400	玉山区下田宇障場~同学生出袋の道路改良(歩 道設置) 延長 1,430m 歩道幅員 2.0m(片側設置)		
111	その他市道 洗民門前寺線	ハード	道路建設課	玉山	18	18~20	完了	100,000	212,500	212,500	212,500	0	0	玉山区洗民宇岩鼻(盛岡工業団地付近)~国道4 号洗民バイパス~国道4号の道路改良 延長 690m 幅員 9.5m		

主要 施策	個別施策	No.	事業名	区分	担当課等	区域	事業実施時期			事業費					事業の概要等		
							計画	実績 (見込)	H25末 の状況	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	H25まで の実績	H24まで			H26 予算	
													の実績	H25決算 繰越額含む			
VI 多様な交 流を支え る都市基 盤の整備	交通基盤 の整備	112	一般市道 一の波岩洞湖線	ハード	道路建設課	玉山	20~23	23~33	着手中	200,000	327,095	72,790	42,992	29,798	126,200	岩洞湖北側の周回道路の改良 延長 11,160m 幅員 6.0m(歩道なし)	
		113	その他市道 二子沢線	ハード	道路建設課	玉山	25~27	25~28	着手中	300,000	170,000	4,067	0	4,067	81,100	玉山区玉山字大二子地内~広城嵐道間の道路改良 延長 2,000m 幅員 6.0m(歩道なし)	
		114	二級市道 山形線	ハード	建設課(玉山)	玉山	18~21	18	完了	200,000	19,579	19,579	19,579	0	0	0	玉山区馬場字太子堂~同字葛巻(大神地区)の道路(3,202m)のうち、大神地区付近 635m(有効幅員 6.0m、歩道なし)の整備
		115	その他市道 洗民東線	ハード	道路建設課	玉山	27	26~29	未着手	50,000	50,000	0	0	0	5,000	玉山区洗民字愛宕地内の道路改良 延長 243.7m 幅員 6.0m(歩道なし)	
		116	その他市道 舟田下田線	ハード	道路建設課	玉山	18~19	18~21	完了	100,000	403,167	403,167	403,167	0	0	0	玉山区下田字船綱(舟田橋西)~こぶしが丘団地~同字下田(下田踏切)の道路改良 延長 1,820m 幅員 7.5m~10.0m(片側歩道 2.5m)
		117	その他市道 好摩南枝線(好摩南4・5号線)	ハード	道路建設課	玉山	24~26	18~21	完了	60,000	75,392	75,392	75,392	0	0	0	玉山区好摩字夏間木地内の道路改良 延長 430m 幅員 3.5m~5.0m
		118	樹沢橋改良事業	ハード	道路建設課	玉山	21~24	23~28	着手中	900,000	954,351	346,114	177,517	168,597	256,000	北上川に架かる橋りょうの架替、接続道路の改良(歩道設置)等 位置:玉山区好摩字中塚地内 延長 561.2m(うち橋りょう部 61.2m) 幅員 9.5m(片側歩道 2.5m)	
		119	IGR好摩駅周辺整備事業	ハード	道路建設課	玉山	18~19	18~24	完了	215,000	1,387,466	1,387,565	1,387,565	0	0	0	IGR好摩駅西口の広場及び道路整備、東西連絡通路の整備 東西連絡通路:延長 60m 幅員 4.0m 道路(好摩字田向線歩道設置) 延長 200m 歩道幅員 2.5m
		120	好摩西部地区計画道路	ハード	道路建設課	玉山	23~27	24~29	着手中	400,000	76,624	20,593	1,024	18,569	20,400	20,400	玉山区夏間木地内の道路改良 延長 600m 幅員 9.0m(片側歩道 2.0~2.5m)
	上・下水道 の整備	121	舟田西枝線(洗民駅周辺地区計画道路)	ハード	道路建設課	玉山	21~23	23~28	着手中	57,000	56,596	34,610	26,592	8,018	42,000	42,000	玉山区下田字陣場地内の道路築造 延長 356.4m 幅員 6.0m(歩道なし)
		122	水道等整備事業(川又地区)	ハード	廃棄物対策課	玉山	18~20	18~21	完了	34,000	23,511	23,511	23,511	0	0	0	給水工事費の一部補助
		123	水道未普及地域解消事業(飲料水供給施設)	ハード	環境企画課	玉山	20~27		未着手	200,000	200,000	0	0	0	0	0	水道未普及地域における簡易水道等の整備
124		[企業会計等]公共下水道	ハード	下水道整備課	盛岡	18~27	18~27	着手中	26,365,000	17,016,111	14,457,579	13,264,605	1,192,974	972,280	972,280	盛岡地域における公共下水道(汚水、雨水、合流式改善)の整備	
125		[企業会計等]公共下水道	ハード	下水道整備課	玉山	18~27	18~27	着手中	3,000,000	1,730,535	1,411,513	1,356,067	55,448	59,200	59,200	玉山区における公共下水道の整備	

主要 施策	個別施策	No.	事業名	区分	担当課等	区域	事業実施時期			事業費					事業の概要等	
							計画	実績 (見込)	H25末 の状況	計画額 【変更前】	計画額 【変更後】	H25まで の実績	H24まで の実績	H25決算 繰越額含む		H26 予算
VI 多様な交 流を支え る都市基 盤の整備	上・下水道 の整備	126	浄化槽整備事業	ソフト	給排水課	盛岡	18~27	18~27	着手中	—	—	92,991	83,075	9,916	9,694	盛岡地域において浄化槽を設置する個人への補助
		127	浄化槽設置整備事業	ソフト	給排水課	玉山	18~27	18~27	着手中	—	—	25,058	25,058	0	882	玉山区において浄化槽を設置する個人への補助
		128	[企業会計等]浄化槽設置整備推進事業	ハード	玉山事務所 (上下水)	玉山	19~27	19~27	着手中	297,000	149,065	108,968	88,761	20,207	22,833	市町村設置型の浄化槽整備(玉山区)

## ハード事業96事業の実績と今後の見通し

## ■ ハード事業総括表① (事業数)

区域	計画数 【変更前】	計画数 【変更後】	H25末					H26末					H27末				
			未着手 事業	着手中 事業	完了 事業	着手率	完了率	未着手 事業	着手中 事業	完了 事業	着手率	完了率	未着手 事業	着手中 事業	完了 事業	着手率	完了率
盛岡	28	29	1	15	13	96.6%	44.8%	1	13	15	96.6%	51.7%	1	9	19	96.6%	65.5%
玉山	59	60	13	20	27	78.3%	45.0%	12	20	28	80.0%	46.7%	11	18	31	81.7%	51.7%
盛岡玉山	7	7		5	2	100.0%	28.6%		5	2	100.0%	28.6%		2	5	100.0%	71.4%
合計	94	96	14	40	42	85.4%	43.8%	13	38	45	86.5%	46.9%	12	29	55	87.5%	57.3%

(備考) 着手率、完了率は計画数【変更後】に対する率

## ■ ハード事業総括表② (事業費及び合併特例債)

(単位 千円)

区域	計画額 【変更前】		計画額 【変更後】		H18~25実績		H25決算(繰越額含む)		H18~26(見込)		H26予算		H18~27(見込)		H27見込	
	特例債		特例債		特例債		特例債		特例債		特例債		特例債		特例債	
盛岡	76,463,777	9,306,100	64,595,336	11,310,200	55,830,787	6,951,000	4,142,994	662,100	60,383,670	8,493,500	4,532,883	1,542,500	66,031,874	10,157,600	5,668,204	1,664,100
					(73.0%)				(78.9%)				(86.4%)			
玉山	19,462,698	6,462,900	16,032,925	5,183,000	11,152,380	2,573,700	493,415	146,700	12,555,357	3,273,300	1,402,977	699,600	14,328,957	4,275,400	1,773,600	1,002,100
					(57.3%)				(64.5%)				(73.6%)			
盛岡玉山	2,680,261	1,672,800	1,876,160	937,500	1,790,057	937,500	126,113		1,806,510	937,500	16,453		1,839,332	937,500	32,822	
					(66.8%)				(67.4%)				(68.6%)			
合計	98,606,736	17,441,800	82,504,421	17,430,700	68,773,224	10,462,200	4,762,522	808,800	74,725,537	12,704,300	5,952,313	2,242,100	82,200,163	15,370,500	7,474,626	2,666,200
					(69.7%)				(75.8%)				(83.4%)			

(備考) (%)は計画額【変更前】に対する執行率

No	事業名	区域	事業実施時期			事業費											
			計画	実績 (見込)	完了 年度	計画額 【変更前】		計画額 【変更後】		H18~25実績		H25決算(繰越額含む)		(参考) H26予算		(参考) H27見込	
						特例債		特例債		特例債		特例債		特例債		特例債	
1	証明書自動交付機設置事業	玉山	18~22	18~19	19	31,381		10,983		10,983							
3	移動通信用鉄塔整備事業	玉山	18~22	18~21	21	368,000		136,296		136,296							
4	コミュニティ消防センター整備事業 (釘の平地区)	玉山	18~20	18~19	19	55,000	49,900	62,574	57,800	62,574	57,800						
5	コミュニティ消防センター整備事業 (小貝沢地区)	盛岡	18	18	18	20,000	19,000	20,874	19,100	20,874	19,100						
6	消防署玉山分署建設事業	玉山	18~20	18~20	20	364,000		334,935		334,935							
7	消防施設整備事業	玉山	18~27	18~27		271,700		230,635	38,800	189,368	23,400	1,885		27,602		40,977	16,300
8	都市基盤河川改修事業	盛岡	18~27	18~27		3,000,000		2,931,564	187,800	2,342,763		294,399		294,400		294,400	
9	準用河川 大橋川改修事業	玉山	18~21	18~21	21	300,000		358,959		358,959							
10	市道除排雪事業(小型除雪機の貸出等)	盛岡 玉山	18~27	18~27		110,000		394,906		343,536		24,149		2,800		19,169	
11	保健所設置事業	盛岡 玉山	19~20	18~19	19	1,500,000	1,425,000	1,034,841	937,500	1,034,841	937,500						
22	盛岡駅周辺地区バリアフリー整備 事業	盛岡	18~20	18~21	21	50,000		33,892		33,892							
23	火葬場整備事業	盛岡	18~22	18~24	24	2,595,570	2,161,500	2,970,943	2,724,400	2,968,943	2,692,000						
24	岩手・玉山斎場整備事業	玉山	20			65,400		65,400	62,100								
25	小学校整備事業	盛岡	18~27	18~27		4,287,731	2,801,800	2,272,360	1,188,800	1,580,018	685,900	111,274	76,100	234,774	129,100	438,307	305,300
26	済民小学校施設整備事業	玉山	18~21	18~24	24	1,373,581	834,500	1,428,895	906,700	1,427,536	905,400						
27	玉山小学校施設整備事業	玉山	25~27			438,200	290,300	52,755	31,600								
28	巻堀小学校体育施設整備事業	玉山	18~19	18~19	19	67,550		62,413		62,413							
29	中学校整備事業	盛岡	18~27	18~29		5,144,901	3,104,700	3,742,941	1,970,400	3,354,704	1,284,800	363,147	177,500	132,775	92,200	35,947	33,800
30	巻堀中学校施設整備事業	玉山	21~25	25~28		1,113,598	718,600	605,699	424,600	38,255	38,300	38,255	38,300	558,064	449,700	672,939	546,700
31	学校給食調理場設備改善事業	盛岡	18~20	18~20	20	42,786		33,396		33,396							
32	学校給食センター施設更新事業	玉山	18	18~21	21	100,000	95,000	33,637		33,637							
33	学校プール整備事業	盛岡	18~27	18~31		770,000		243,291	38,000	205,433	2,100			4,237	3,900	86,798	62,900
36	公民館建設事業(松園)	盛岡	18~19	18~24	24	500,000	475,000	569,212	496,100	573,231	496,100						

No	事業名	区域	事業実施時期			事業費											
			計画	実績 (見込)	完了 年度	計画額 【変更前】		計画額 【変更後】		H18～25実績		(参考) H25決算(繰越額含む)		(参考) H26予算		(参考) H27見込	
						特例値	特例値	特例値	特例値	特例値	特例値	特例値	特例値	特例値	特例値		
37	玉山地区公民館整備事業	玉山	19	19～21	21	240,000	228,000	177,852	161,800	177,852	161,800						
39	地区集会施設整備事業	玉山	18～24	18～25	25	218,000		326,798	44,500	324,929	44,500	43,465					
41	生涯スポーツ施設整備事業	盛岡	25～27	25～28		—		2,118,151	1,916,500	420,155	335,900	420,155	335,900	1,316,721	1,250,500	1,359,434	1,262,300
42	社会教育施設整備事業	玉山	18～21	22～25	25	417,600		413,220	365,300	421,927	387,100	10,845	10,300				
43	運動公園整備事業	玉山	20～23	27～28		400,000		400,000	380,000							200,569	183,700
46	遺跡の広場ネットワーク整備事業	盛岡 玉山	18～27	18～*		345,661		116,853		116,301		736		429		429	
47	歴史民俗資料館建設事業	玉山	21～22			400,000	380,000	400,000	380,000								
49	洪民団地建替事業	玉山	18～21	18～20	20	160,000		98,593		98,593							
50	夏間木第1団地建替事業	玉山	23～26	21～23	23	400,000		384,535		384,535							
51	花と緑のガーデン都市づくり事業	盛岡 玉山	18～27	18～27		119,800		150,379		120,422		12,450		13,224		13,224	
52	洪民地区公園整備事業	玉山	18. 21	18. 21	21	40,000		39,642		39,642							
53	廃棄物処分場整備事業	玉山	18～19	18～20	20	1,683,380		1,669,450		1,669,450							
55	生出地域エコタウン事業	玉山	25～27	25～*		—		593,554	410,100	51,300		51,300		46,570	42,900	42,008	25,600
59	啄木の郷観光ルート整備事業	盛岡 玉山	18～22	18～22	22	197,400	118,600	25,079		25,079							
60	岩洞湖家族旅行村木歩道整備事業	玉山	19～20	19	19	30,000	28,400										
62	桜の里整備事業	玉山	22～23	24～28		150,000	142,500	152,070		3,344		1,575		8,186		65,612	
63	道の駅設置事業	玉山	19			300,000		300,000	142,500								
64	産業クラスター推進事業 (産学官連携新産業創出事業)	盛岡	18～19	18～19	19	988,000	469,300	774,661	381,100	774,661	381,100						
65	ものづくり産業推進事業	玉山	22～25	18～*		413,090	298,600	52,438	47,500	2,438							
66	農村交流センター整備事業	盛岡 玉山	18～20	23～*		241,000	129,200	90,223		92,001		85,779					
70	団体営基盤整備促進事業(好摩地区)	玉山	21～25	25～28		25,200		9,900		3,197		3,197		3,300		3,800	
71	団体営基盤整備促進事業(尻志田地区)	玉山	21～24	25～29		152,000		66,000	28,000	5,999	2,500	5,999	2,500	10,000	4,200	64,000	27,300
72	団体営基盤整備促進事業(寺林地区)	玉山	20～24			34,500		1,700									

No	事業名	区域	事業実施時期			事業費											
			計画	実績 (見込)	完了 年度	計画額 【変更前】		計画額 【変更後】		H18～25実績		(参考) H26予算		(参考) H27見込			
						特例値	特例値	特例値	特例値	特例値	特例値	特例値					
73	団体営基盤整備促進事業(武道地区)	玉山	23～27	24～32		51,750		7,880	2,800	3,317		587		2,110		5,000	4,700
74	有機物資源活用センター整備事業	玉山	19～20	20～24	24	980,000	416,500	496,449	464,000	495,939	448,300						
75	有機物資源活用促進事業	玉山	18～20	18～21	21	19,040		1,179		1,179							
76	排水対策特別事業船田地区	玉山	21～25			32,600		2,500									
77	県営ため池等整備事業(一般)洗民地区	玉山	18～21	18～24	24	31,130		29,772	700	29,772	700						
78	県営かんがい排水事業(一般)松川大堰地区	玉山	19～23			20,000		2,500									
79	農免農道整備事業 巻堀2期地区	玉山	24～27	24～30		20,000		33,584	28,100	4,333	2,700	567	500	4,012	3,800	12,670	12,000
83	盛岡南地区都市開発整備事業	盛岡	18～27	18～27		10,062,073		6,833,605		6,391,082		328,662		303,809		215,318	
84	盛岡駅西口地区土地区画整理事業	盛岡	18～25	18～21	21	5,075,741		5,854,018		5,854,018							
85	まちづくり交付金事業(盛岡駅西口地区)	盛岡	19～27	19～23	23	1,328,000		877,940		877,940							
86	盛岡駅西口地区駐車場整備事業	盛岡	19～27			74,000		10,000									
88	洗民駅北地区土地区画整理事業	玉山	25～27			72,000		10,000									
89	野中土地区画整理事業補助金	玉山	27			29,000		10,000									
90	バス利用促進対策事業	盛岡 玉山	18～20 22	18～27		166,400		63,879		57,877		2,999					
91	広域圏道路整備事業「北松岡四丁目小島沢線」	盛岡	18～21	18～22	22	614,275		897,326		897,326							
92	広域圏道路整備事業「市道谷地頭線」	盛岡	18～26	19～26		1,250,000		1,027,244	250,400	884,524	157,400	68,161	49,000	120,500	62,100		
93	都市計画道路 中ノ橋山岸線Ⅲ工区	盛岡	18～21	18～24	24	1,197,800		1,630,477		1,630,409							
94	都市計画道路 梨木町上米内線Ⅱ工区	盛岡	18～26	18～30		5,038,800		5,471,911	525,800	4,331,752		311,123		393,230		607,500	
95	都市計画道路 盛岡駅南大通線(不來方橋)	盛岡	18	18	18	148,600		225,384		225,384							
96	都市計画道路 盛岡駅南大通線(神子田Ⅰ)	盛岡	18～27	18～24	24	1,243,200		863,201		863,046							
97	都市計画道路 盛岡駅南大通線(大沢川原)	盛岡	18～27	18～29		1,930,000		1,908,310	50,600	1,797,046		154,508		88,000		129,700	
98	都市計画道路 明治橋大沢川原線(大通)	盛岡	20～27	19～29		960,000		2,160,911	381,900	1,605,697		491,396		302,957		437,200	
99	都市計画道路 盛岡駅奇山線(R46交差部)	盛岡	18～19	18～19	19	687,300		669,865		669,865							



No	事業名	区域	事業実施時期			事業費											
			計画	実績 (見込)	完了 年度	計画額 【変更前】		計画額 【変更後】		H18～25実績		(参考) H26予算		(参考) H27見込			
						特例値		特例値		特例値		特例値		特例値			
100	都市計画道路 盛岡駅青山線(前九年Ⅱ)	盛岡	19～27	20～28		805,000		391,084	133,200	248,347		72,106		95,000		40,000	
101	都市計画道路 上厨川厨川五丁目線(赤巻Ⅱ)	盛岡	18～23	19～29		525,000		337,707	51,100	296,453		68,747		41,000		40,000	
102	都市計画道路 岩手飯岡駅南公園線外1路線	盛岡	22～27	21～32		760,000		870,458	83,500	687,204		217,722		223,200		168,000	
103	都市計画道路 洺民鶴飼線	玉山	18	18	18	300,000	285,000	64,000	27,100	64,000	27,100						
104	厨川駅地下自由通路及び西口整備事業	盛岡	18～22	18～26		1,000,000	474,800	1,839,699	913,500	1,805,245	896,600	48,620	23,600	10,000	4,700		
105	IGR下田駅設置事業	玉山	27			110,000		110,000	104,500								
106	一級市道 沢目線	玉山	18	18	18	47,000	44,600	12,500	5,300	12,500	5,300						
107	一級市道 好摩永井線	玉山	18～22	18～30		400,000	380,000	300,887	127,600	279,454	118,100	660	200	12,500	5,300	30,000	12,800
108	一級市道 洺民好摩線	玉山	19～23	20～30		800,000	760,000	270,583	118,200	147,009	63,000	479	100	39,000	17,100	20,600	9,100
109	一級市道 下田生出線	玉山	20～24	22～32		520,000	494,000	169,348	68,900	117,921	47,200			40,500	17,500	41,200	18,200
110	一級市道 柴沢下田線	玉山	21～24	24～30		307,000	291,600	206,949	89,800	38,425	16,600	28,899	12,500	40,400	17,700	78,000	34,300
111	その他市道 洺民門前寺線	玉山	18	18～20	20	100,000		212,500		212,500							
112	一級市道 一の波岩洞湖線	玉山	20～23	23～33		200,000		327,095		72,790		29,798		126,200		100,900	
113	その他市道 二子沢線	玉山	25～27	25～28		300,000		170,000		4,067		4,067		81,100		51,100	
114	二級市道 山形線	玉山	18～21	18	18	200,000		19,579		19,579							
115	その他市道 洺民東線	玉山	27	26～29		50,000		50,000	21,300					5,000	2,100	53,600	23,700
116	その他市道 舟田下田線	玉山	18～19	18～21	21	100,000		403,167		403,167							
117	その他市道 好摩南枝線	玉山	24～26	18～21	21	60,000		75,392		75,392							
118	樹沢橋改良事業	玉山	21～24	23～28		900,000	374,000	954,351	420,400	346,114	150,300	168,597	72,400	256,000	112,500	185,000	81,700
119	IGR好摩駅周辺整備事業	玉山	18～19	18～24	24	215,000		1,387,466	51,800	1,387,565	51,800						
120	好摩西部地区計画道路	玉山	23～27	24～29		400,000	351,400	76,624	32,800	20,593	8,900	19,560	8,500	20,400	8,900	14,200	6,000
121	舟田西枝線(洺民駅周辺地区計画道路)	玉山	21～23	23～26		57,000		56,596	24,400	34,610	14,900	8,018	3,400	42,000	17,900		
122	水道等整備事業(川又地区)	玉山	18～20	18～21	21	34,000		23,511		23,511							

事業		区域	事業実施時期			事業費											
No	事業名		計画	実績 (見込)	完了 年度	計画額 【変更前】		計画額 【変更後】		H18～25実績		H25決算(繰越額含む)		(参考) H26予算		(参考) H27見込	
						特例債	特例債	特例債	特例債	特例債	特例債	特例債	特例債				
123	水道未普及地域解消事業(飲料水供給施設)	玉山	20～27			200,000		200,000	114,000								
124	[企業会計等]公共下水道	盛岡	18～27	18～27		26,365,000		17,015,111		14,457,579		1,192,974		972,280		1,817,600	
125	[企業会計等]公共下水道	玉山	18～27	18～27		3,000,000		1,730,535		1,411,513		55,446		59,200		70,000	
128	[企業会計等]浄化槽設置整備推進事業	玉山	19～27	19～27		297,000		149,065		108,968		20,207		22,833		21,425	

## 平成27年度までに完了が見込めない41事業

## ■ 盛岡区域(10事業)

No	事業名	区域	計画年度	実施年度 (予定)
29	中学校整備事業	盛岡	18~27	18~29
33	学校プール整備事業	盛岡	18~27	18~31
41	生涯スポーツ施設整備事業	盛岡	25~27	25~28
86	盛岡駅西口地区駐車場整備事業	盛岡	19~27	未着手
94	都市計画道路 梨木町上米内線Ⅱ工区	盛岡	18~26	18~30
97	都市計画道路 盛岡駅南大通線(大沢川原)	盛岡	18~27	18~29
98	都市計画道路 明治橋大沢川原線(大通)	盛岡	20~27	19~29
100	都市計画道路 盛岡駅育山線(前九年Ⅱ)	盛岡	19~27	20~28
101	都市計画道路 上厨川厨川五丁目線(赤巻Ⅱ)	盛岡	18~23	19~29
102	都市計画道路 岩手飯岡駅南公園線外1路線	盛岡	22~27	21~32

## ■ 玉山区域(29事業)


No	事業名	区域	計画年度	実施年度 (予定)
24	岩手・玉山斎場整備事業	玉山	20	未着手
27	玉山小学校施設整備事業	玉山	25~27	未着手
30	巻堀中学校施設整備事業	玉山	21~25	25~28
43	運動公園整備事業	玉山	20~23	27~28
47	歴史民俗資料館建設事業	玉山	21~22	未着手
55	生出地域エコタウン事業	玉山	25~27	25~*
62	桜の里整備事業	玉山	22~23	24~28
63	道の駅設置事業	玉山	19	未着手
65	ものづくり産業推進事業	玉山	22~25	18~*
70	団体営基盤整備促進事業(好摩地区)	玉山	21~25	25~28
71	団体営基盤整備促進事業(尻志田地区)	玉山	21~24	25~29
72	団体営基盤整備促進事業(寺林地区)	玉山	20~24	未着手
73	団体営基盤整備促進事業(武道地区)	玉山	23~27	24~32
76	排水対策特別事業船田堰地区	玉山	21~25	未着手
78	県営かんがい排水事業(一般)松川大堰地区	玉山	19~23	未着手
79	農免農道整備事業 巻堀2期地区	玉山	24~27	24~30
88	洗民駅北地区土地区画整理事業	玉山	25~27	未着手
89	野中土地区画整理事業補助金	玉山	27	未着手
105	IGR下田駅設置事業	玉山	27	未着手
107	一級市道 好摩永井線	玉山	18~22	18~30
108	一級市道 洗民好摩線	玉山	19~23	20~30
109	一級市道 下田生出線	玉山	20~24	22~32
110	一級市道 柴沢下田線	玉山	21~24	24~30
112	一級市道 一の渡岩洞湖線	玉山	20~23	23~33
113	その他市道二子沢線	玉山	25~27	25~28
115	その他市道 洗民東線	玉山	27	26~29
118	樹沢橋改良事業	玉山	21~24	23~28
120	好摩西地区計画道路	玉山	23~27	24~29
123	水道未普及地域解消事業(飲料水供給施設)	玉山	20~27	未着手

## ■ 盛岡玉山区域(2事業)

No	事業名	区域	計画年度	実施年度 (予定)
46	遺跡の広場ネットワーク整備事業	盛岡玉山	18~27	18~*
66	農村交流センター整備事業	盛岡玉山	18~20	23~*



新市建設計画主要事業位置図〔盛岡区域〕

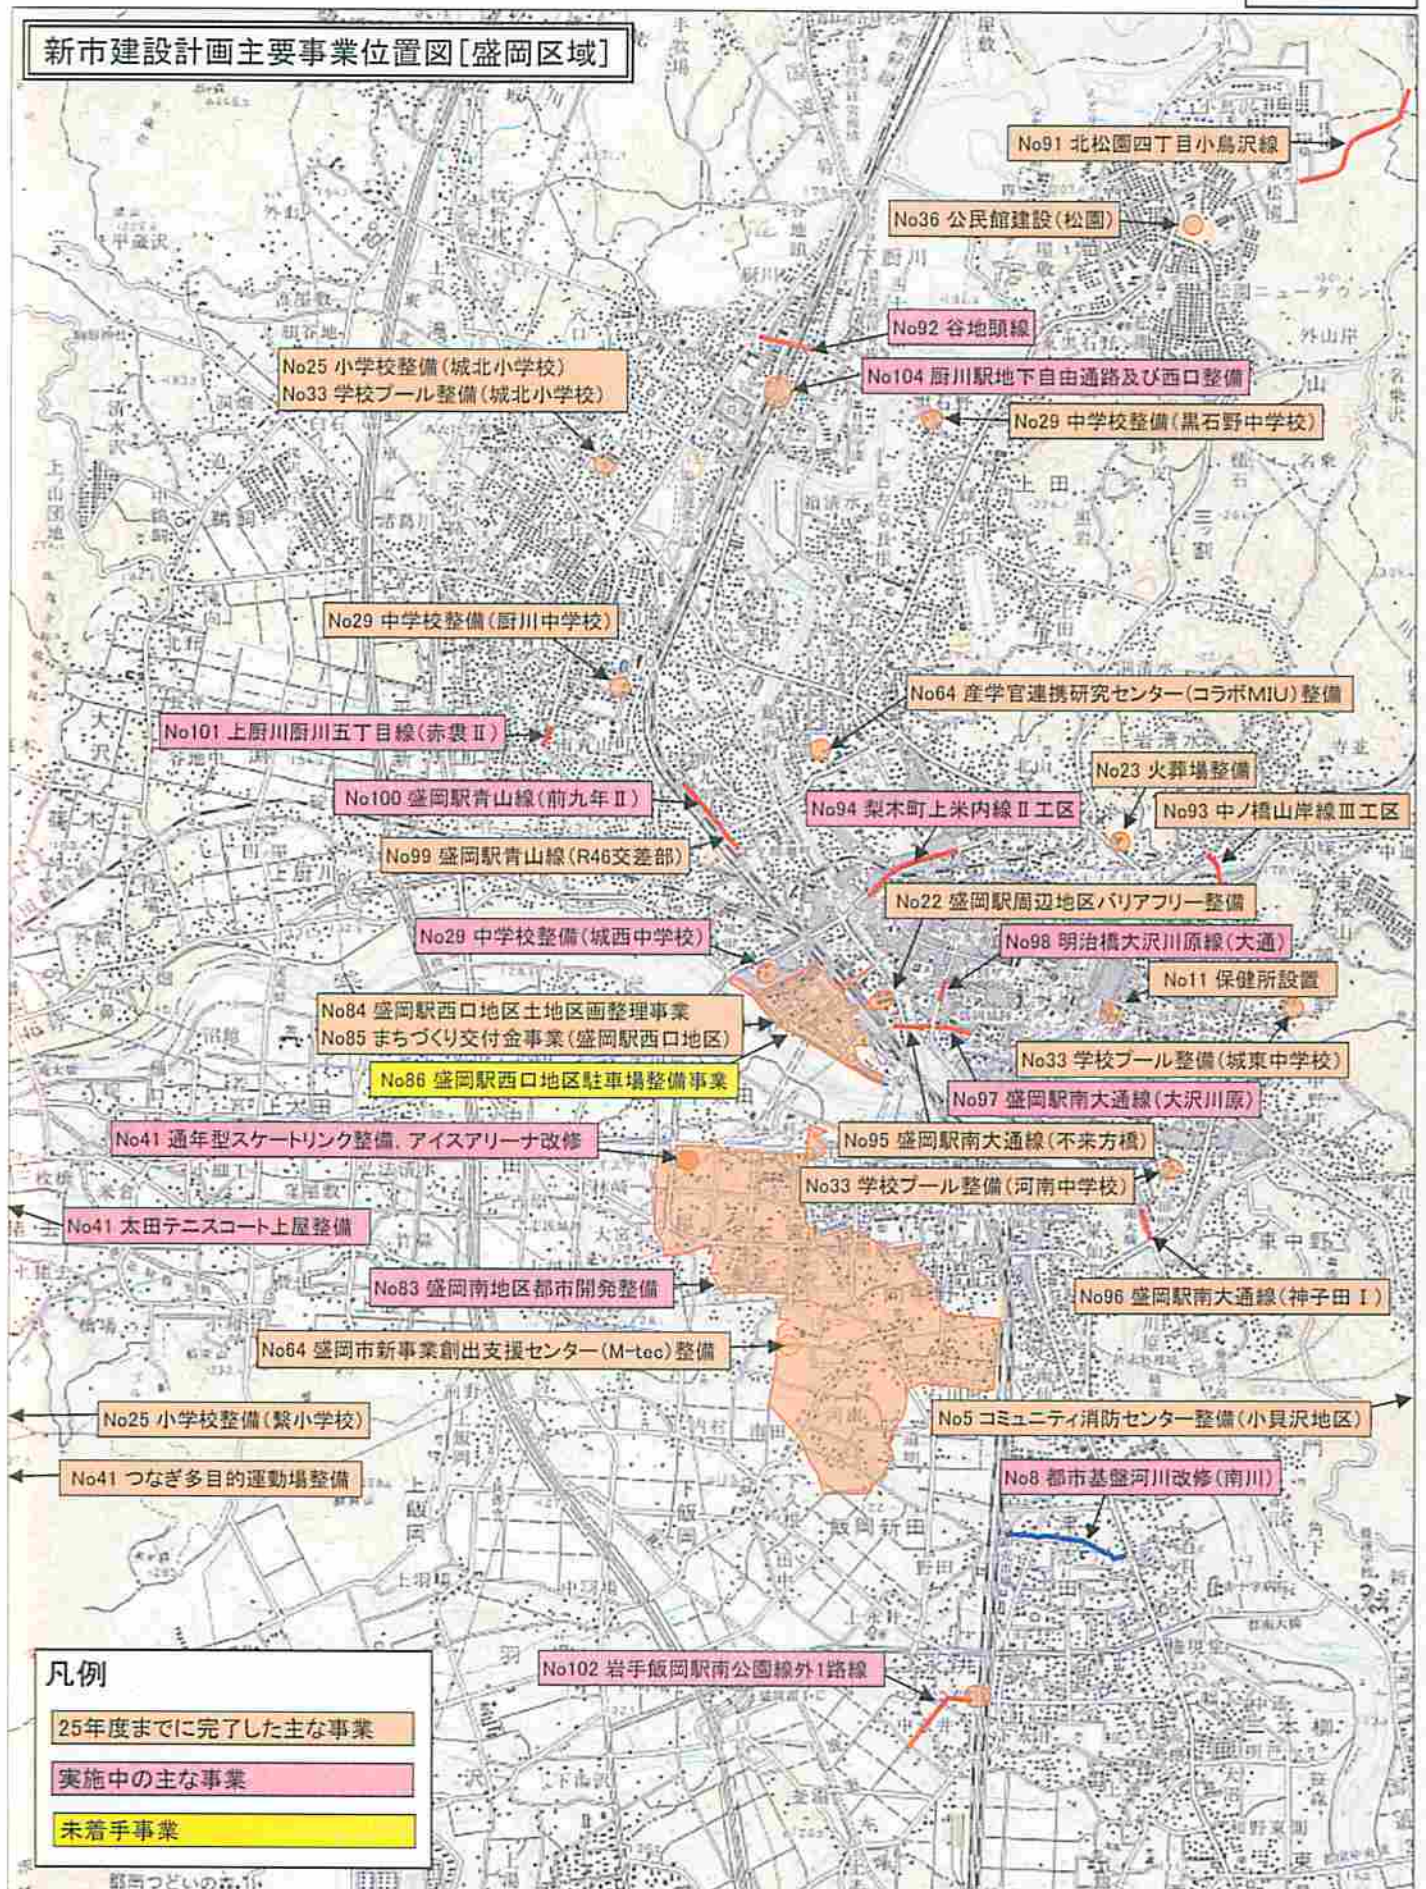

凡例

25年度までに完了した主な事業

実施中の主な事業

未着手事業

「No25 小学校整備事業」は、表示している学校のほかに、太田東、厨川、松園、青山小学校の校舎の耐震工事を実施。  
 「No29 中学校整備事業」は、表示している学校のほかに、下橋、大宮中学校の校舎の耐震工事を実施。  
 「No33 学校プール整備事業」は、表示している学校のほかに、緑が丘小学校、土淵小中学校などの改修工事を実施。



