

盛岡市新火葬場駐車場棟及び国道4号取付道路の供用開始日の変更について

平成24年8月27日
市 民 部

盛岡市新火葬場（盛岡市斎場やすらぎの丘）については、平成22年7月から建設を進め、東日本大震災の影響等により3か月遅れて平成24年2月に火葬棟を供用開始した。今後は、現在建設中の駐車場棟及び国道4号取付道路（市道三ツ割72号線）の完成をもって全面供用開始とする計画としている。

1 供用開始日の変更について

盛岡市新火葬場（盛岡市斎場やすらぎの丘）について、駐車場棟及び国道4号取付道路の供用開始予定を次のとおり変更しようとするものである。

- ・変更前供用開始予定 平成24年10月
- ・変更後供用開始予定 平成24年12月1日

2 変更理由について

次の理由により、建設工事に約90日間の遅れが生じた。当初予定どおり平成24年10月全面供用開始を目指し工事工程の調整に努めたものの、約60日間の遅れが生じることとなった。

- (1) 東日本大震災の影響等により約90日間の遅れが生じ、新火葬棟の開業が当初予定の平成23年11月1日から平成24年2月1日に変更となった。
- (2) 火葬場の運営を継続しながら工事を行うため、新火葬棟の開業後に旧火葬場を解体し、駐車場棟の建設工事に着手するため、建設工事の着手時期に約90日間の遅れが生じ、平成23年11月から平成24年2月に変更となった。

3 供用開始日の変更に伴う対応について

- (1) 現在運行している臨時駐車場と火葬場間を連絡するシャトルバスについては、全面供用開始まで運行を継続することとする。
- (2) 新火葬場使用料については、平成23年12月議会で条例改正を行い、市民は無料から1万円に、市民以外は2万円から5万円に改定したが、全面供用開始時期となる平成24年12月1日に施行する予定である。

4 これまでの経緯

平成21年8月24日 全員協議会で説明

- ・火葬棟供用開始は平成23年11月を予定
- ・駐車場棟供用開始は平成24年10月を予定

9月30日 「設計・施工一括型工事請負契約」議決


平成22年2月15日 全員協議会で説明

- ・火葬棟供用開始は平成23年11月を予定

- 6月 愛宕町臨時駐車場開設, シャトルバス運行開始
- 7月 新火葬場火葬棟建設工事着工
- 平成23年 9月26日 全員協議会で説明
 - ・火葬棟供用開始を平成24年2月1日に変更
- 11月24日 全員協議会で説明
 - ・新火葬場使用料の適用は, 駐車場棟及び国道4号取付道路の供用開始時点(平成24年10月)を予定
- 平成24年 2月1日 新火葬場火葬棟供用開始
- 2月24日 平成24年11月30日まで工期を延長する変更契約を締結


5 今後のスケジュール

- 平成24年 9月15日 広報もりおかに全面供用開始日の変更について掲載
- 11月 駐車場棟完成引渡し
- 国道4号取付道路部分引渡し
- 12月1日 全面供用開始
- 平成25年 1月 国道4号取付道路融雪装置試運転完了後に全面引渡し

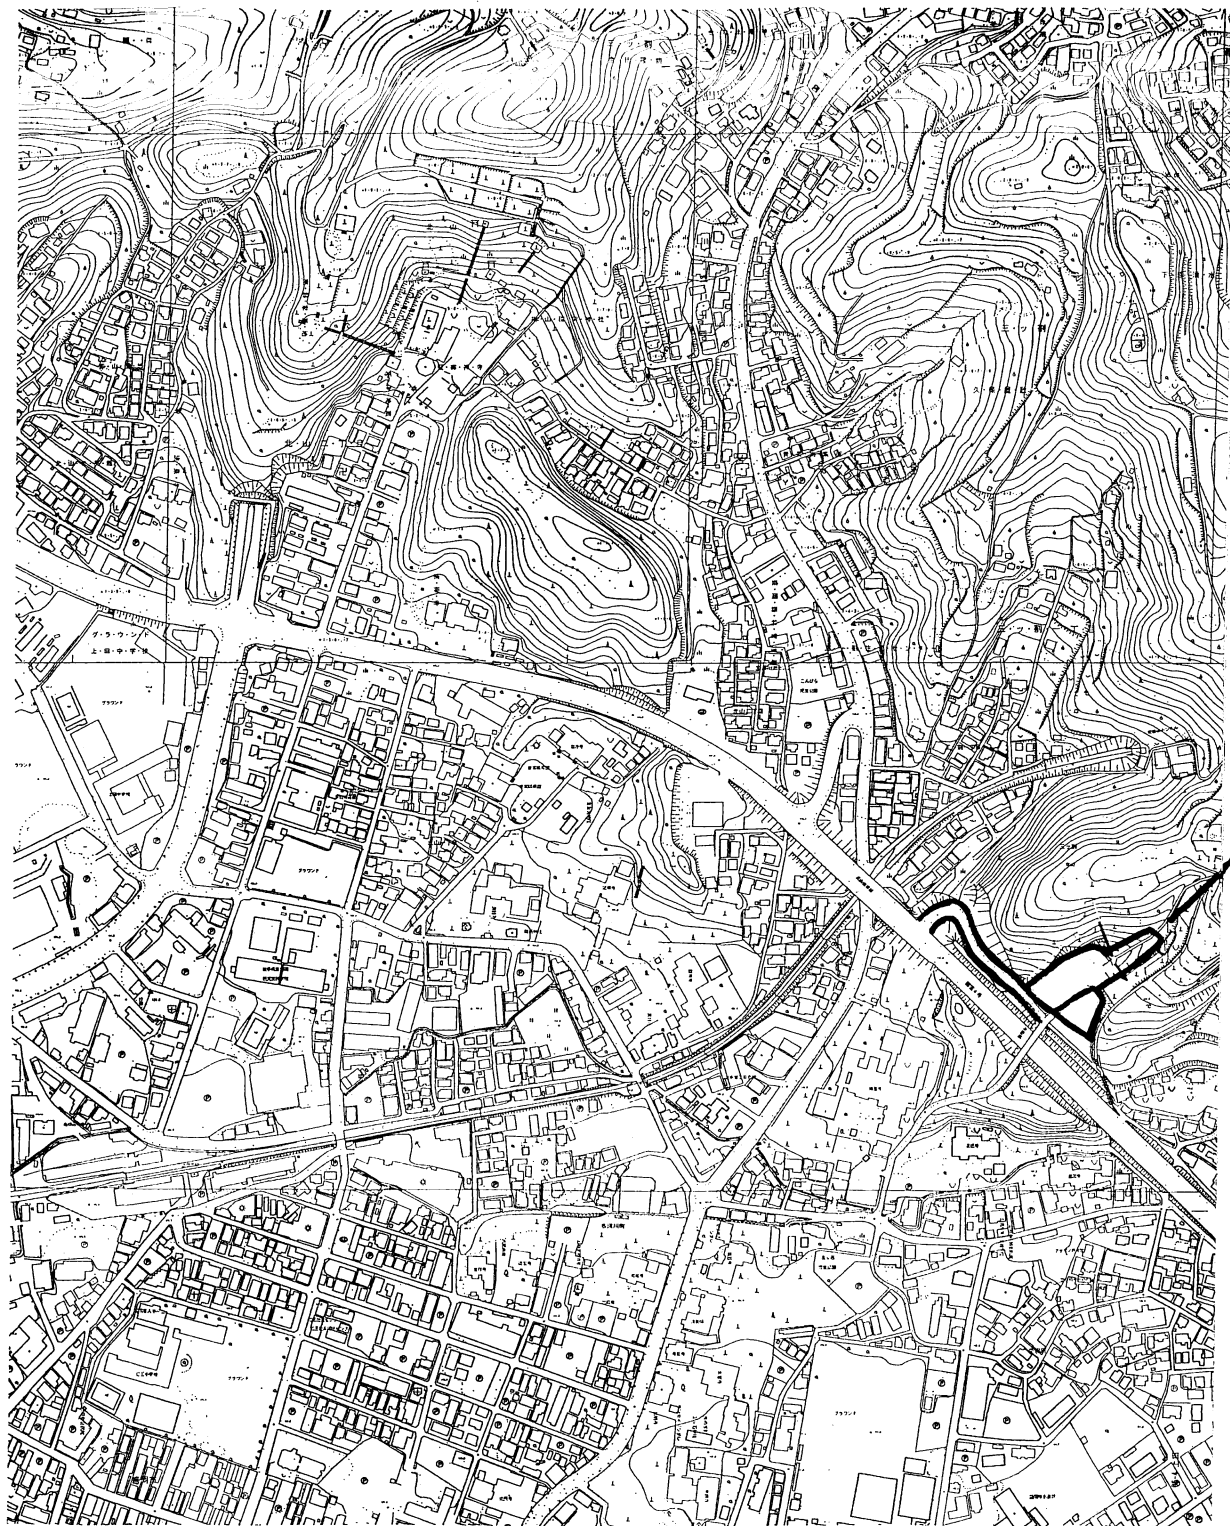

国道4号取付道路(市道三ツ割72号線)

新火葬場駐車場及び国道4号取付道路工事区域図

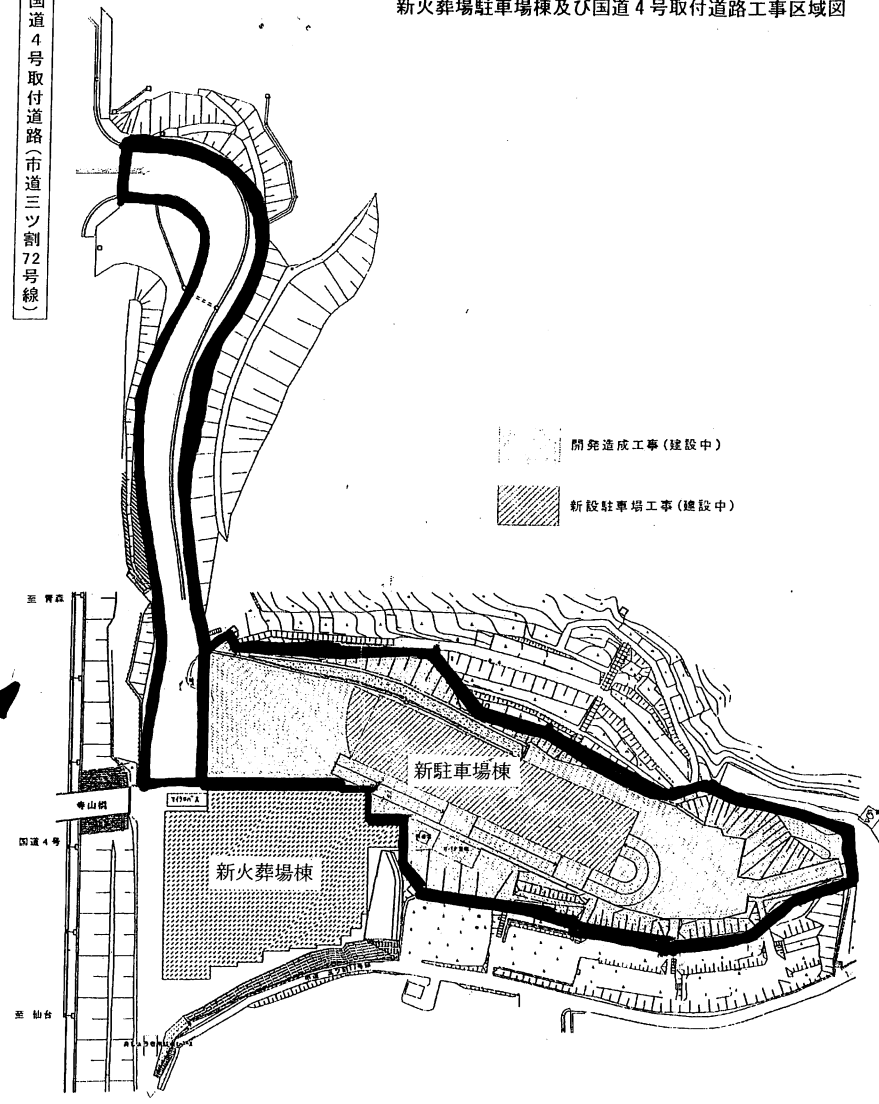

	旧火葬場
	新火葬場

1 火葬件数 (臓器及び人体の一部を除く)

(単位:件)

月	平成24年度		平成23年度		平成22年度	
	火葬件数	(1日当り平均)	火葬件数	(1日当り平均)	火葬件数	(1日当り平均)
4月	214	(7.4)	247 ※	(8.8)	216	(7.7)
5月	240	(8.0)	206	(7.4)	198	(7.0)
6月	217	(7.5)	207	(7.4)	182	(6.5)
7月	223	(7.4)	195	(7.0)	201	(6.9)
8月	-	-	203	(7.0)	201	(6.9)
9月	-	-	178	(6.4)	190	(6.8)
10月	-	-	208	(7.4)	177	(6.3)
11月	-	-	222	(7.9)	190	(6.8)
12月	-	-	234	(8.4)	205	(7.3)
1月	-	-	235	(8.7)	217	(8.0)
2月	-	-	242	(8.6)	196	(7.5)
3月	-	-	267	(8.9)	298 ※	(10.3)
計	894	-	2,644	-	2,471	-

※ 東日本大震災による増を含む。

2 旧火葬場と新火葬場との比較

旧火葬場	火葬件数	開場日数	(1日当り平均)
平成23年4月～平成24年1月	2,135	280日	(7.6)

新火葬場	火葬件数	開場日数	(1日当り平均)	想定火葬件数
平成24年2月～平成24年7月	1,403	176日	(8.0)	8.6

3 火葬取扱件数の推移と将来予測 (平成19年3月公表 盛岡市火葬場整備基本構想より)

