

29盛交号外
平成29年9月22日

市議会議員 各位

建設部長 古山裕康

J R山田線（盛岡～宮古間）運転再開について

土砂流入による列車脱線のため、一部区間で運転見合せとなっていたJ R山田線（盛岡～宮古間）運転再開について、別添資料のとおり本日公表した旨、J R東日本盛岡支社から連絡がありましたのでお知らせいたします。

【問合せ先】

盛岡市建設部交通政策課

課長 千田 敏

電話 651-4111（内線 2760）

2017年9月22日
東日本旅客鉄道株式会社
盛岡支社

山田線(盛岡～宮古間)運転再開について

山田線(盛岡～宮古間)については、2015年12月11日(金)に「松草～平津戸」駅間で発生した土砂流入による列車脱線のため、現在、上米内駅～川内駅間で運転を見合わせております。お客さまには大変ご迷惑をおかけしております。


この間、鋭意復旧作業等をおこなってまいりましたが、このたび、運転再開までのスケジュールに見通しが立ったことから、運転再開日についてお知らせいたします。

1. 山田線(盛岡～宮古間)運転再開日 2017年11月5日(日)

2. 運転再開までのスケジュール

10月中旬 : 斜面安定工終了
10月下旬 : 軌道、信号、通信設備工事終了
11月4日(土)まで: 試運転

3. 山田線(盛岡～宮古間)運転状況

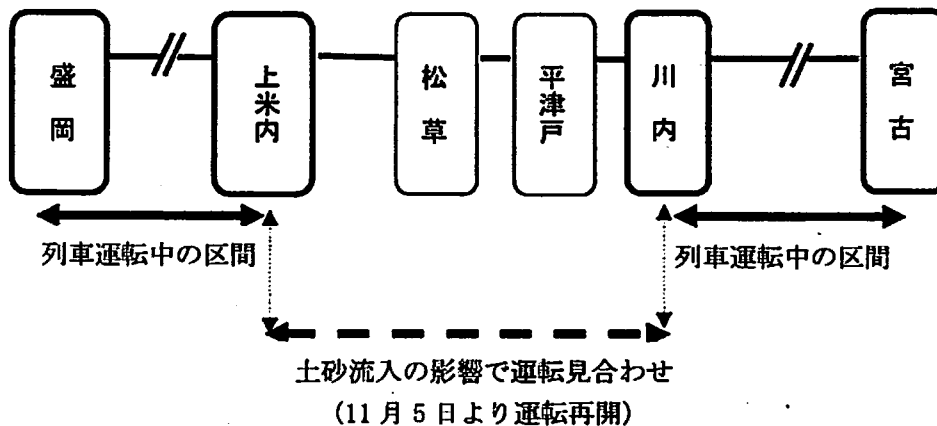

4. 斜面安定工の施工状況 別紙

下部斜面安定工全景 2017年9月18日撮影

※当日は最新版に更新します。



グラウンドアンカー進捗状況(2017年9月18日現在)

上部から施工を開始し、上部1～10段目は施工済み。
現在は11段目のグラウンドアンカー削孔を施工中。

	完了数(本)	全数(本)	進捗率(%)
アンカー挿入	138	146	94.5
受圧板設置	138	146	94.5
アンカー緊張	132	146	90.4
